

चुलाचुली गाउँपालिका
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
चुलाचुली, इलाम

आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रमको
शाखा तथा वडागत प्रतिवेदन



आर्थिक वर्ष २०७८/०७९

योजना शाखा

मिति – २०७८/११/३०

आ.व. २०७८/०७९ मा सञ्चालित योजनाहरू को वित्तिय विवरणको
अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

समिक्षा कार्यक्रम

मिति २०७८ फाल्गुण ३०

आयोजक चुलाचुली गाउँपालिका
इलाम

प्रस्तुतकर्ता

मिलनकुमार भट्टराई

संचितकोषको अवस्था

विवरण	बजेट	प्राप्ति/खर्च	प्रतिसत
पुष मसान्त सम्मको प्राप्ति	४५,८५,७६,४७७.६९	१३,९५,२९,३२१.४९	३०.४२
पुष मसान्त सम्मको खर्च	४५,८५,७६,४७७.६९	८,८४,४२,४२५.०१	१९.२८

आन्तरीक राजश्व

विवरण	पालिकाले सँकलन गरेको	बाँडफाँडबाट प्राप्त	कुल
कर राजस्व	११,२४,७२४।०६	४,६१,०६,१०५।२१	४,७२,३०,८२९।२७
गैर कर राजस्व	९,५५,९६४।१६	५,८८,८११।८०	१५,४४,७७५।९६
अन्य राजस्व	१.२६,५४०।००	०।००	१.२६,५४०।००
जम्मा	२२,०७,२२८।२२	४,६६,९४,९१७।०१	४,८९,०२,१४५।२३

अनुदान तर्फ

विवरण	नेपाल सरकार	प्रदेश सरकार	कुल
समानिकरण अनुदान	३,०७,५०,०००।००	१४,३५,५००।००	३,२१,८५,५००।००
सशर्त अनुदान	८,८७,००,०००।००	१,७६,०००।००	८,८८,७६,०००।००
समपुरक अनुदान	९९,५०,०००।००	३३,००,०००।००	१,३२,५०,०००।००
विशेष अनुदान	०।००	०।००	०।०
जम्मा	१२,९४,००,०००।००	४९,११,५००।००	१३,४३,११,५००।००

अन्तर सरकारी अख्तियारिबाट प्राप्त रकम

क्र स	बार्षिक बजेट	निकास/खर्च	नेपाल सरकार
१	सामाजिक सुरक्षा तथा सँरक्षण	२,८७,८०,२२०।२०	ने स
२	गबिका	१,२०,०००।००	ने स
३	स्थानिय पुर्वाधार बिकास कार्यक्रम	००	ने स
४	स्थानिय तह प्रशासकिय भवन पुर्वाधार कार्यक्रम	००	ने स
५	एकिकृत स्वास्थ्य बिकास कार्यक्रम	२,५७,१६,८३९।९२	ने स
	जम्मा	५,४६,१७,०६०।१२	

क्षेत्रगत बजेट र खर्च विवरण तथा खर्च प्रतिशत

क्र स	क्षेत्र	बार्षिक बजेट	खर्च	प्रतिशत
१	आर्थिक विकास	४,२५,३८,६९७.४९	७३,५२,२०२	१७.२८
२	सामाजिक विकास	१८,३७,५६,२५२.५१	३,७०,१४,०२६.७	२०.१४
३	पुर्वाधार विकास	१६,०३,२१,६९७.६९	१,८२,६२,८३२.६२	११.३९
४	सुशासन	१,०१,०१,९४०	७,०१,७१९.९५	६.९५
५	कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	६,१८,५७,८९०	२,५१,११,६४३.७३	४०.६

क्रमश...

शीर्षक	बजेट	खर्च	प्रतिशत
चालुतर्फ	२६,६७,६९,४७७.४९	६,७९,६९,७९८.७०	२५.४७
पुजिगततर्फ	१९,१८,०७,०००.२०	२,०४,७६,६२६.३१	१०.६७

शसर्त अनुदान

शीर्षक	बजेट	खर्च	प्रतिसत
चालु	१४,८३,४०,०००	३,३८,२६,३०६.९७	२२.८
पुजिगत	६,९७,०२,०००	५३,६०,३०१.८८	७.६९

गाउँपालिका तर्फ

शिर्षक	बजेट	खर्च	प्रतिसत
चालु	७,७०,३२,७८०	२,७१,७८,३५५.६४	३५.२८
पुर्जित	७,५५,३८,१९७.६९	९८,८६,८४५.१३	१३.०८

आन्तरिक स्रोत

सि.नं.	बजेटको स्रोत/तह	प्राप्तिको स्रोत	वार्षिक अनुमानित आय	आम्दानी	बाँकी
१	सडक बोर्ड	१३४११ - अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदान	१९,००,०००	५,८३,३०६	१३,१६,६९४
२	आन्तरिक स्रोत	११३१४ - भुमिकर/मालपोत	२१,५५,०००	४,४०,४१८	१७,१४,५८२
३	आन्तरिक स्रोत	११३२१ - घरवहाल कर	३०,०००	३३,४९०.०७	-३,४९०.०७
४	आन्तरिक स्रोत	११३२२ - वहाल विटौरी कर	५,०००	०	०
५	आन्तरिक स्रोत	११४५१ - सवारी साधन कर (साना सवारी)	५,०००	०	०

क्रमश

६	आन्तरिक श्रोत	११४५२ - पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर	७,००,०००	२,५०,९००	४,४९,१००
७	आन्तरिक श्रोत	११४७९ - अन्य मनोरञ्जन कर	५,०००	०	०
८	आन्तरिक श्रोत	११६११ - व्यवसायले भुक्तानी गर्ने	५०,०००	८,०६,२५०	(७,५६,२५०)
९	आन्तरिक श्रोत	११६३१ - कृषितथा पशुजन्य वस्तुको व्यावसायिक कारोवारमा लाग्ने कर	५,००,०००	०	०
१०	आन्तरिक श्रोत	११६९१ - अन्य कर	१०,१०,०००	०	०
११	आन्तरिक श्रोत	१३४११ - अन्य संस्थागत आन्तरिक अनुदान	४,११,०००	०	०
१२	आन्तरिक श्रोत	१४१५१ - सरकारी सम्पत्तीको वहालबाट प्राप्त आय	२०,००,०००	१०,४००	१९,८९,६००
१३	आन्तरिक श्रोत	१४१५९ - अन्य स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी	१०,०००	०	०
१४	आन्तरिक श्रोत	१४१९१ - पर्यटन शुल्क	१०,०००	०	०
१५	आन्तरिक श्रोत	१४२११ - कृषि उत्पादनको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१०,०००	०	०
१६	आन्तरिक श्रोत	१४२१२ - सरकारी सम्पत्तीको बिक्रीबाट प्राप्त रकम	१०,०००	०	०

क्रमश

१७	आन्तरिक श्रोत	१४२१३ - अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	५,००,०००	१,६६,०००	३,३४,०००
१८	आन्तरिक श्रोत	१४२२१ - न्यायिक दस्तूर	५,०००	०	०
१९	आन्तरिक श्रोत	१४२२४ - परीक्षा शुल्क	१०,०००	९,३००	७००
२०	आन्तरिक श्रोत	१४२२९ - अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	२,५०,०००	०	०
२१	आन्तरिक श्रोत	१४२४२ - नक्सापास दस्तुर	१,००,०००	७०,०३४.१५	२९,९६५.८५
२२	आन्तरिक श्रोत	१४२४३ - सिफारिश दस्तुर	१,००,०००	७,६९,५५४	(६,६९,५५४)
२३	आन्तरिक श्रोत	१४२४४ - व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	२१,००,०००	१६,४००	२०,८३,६००
२४	आन्तरिक श्रोत	१४२४५ - नाता प्रमाणित दस्तुर	५,०००	१८,५००	-१३,५००
२५	आन्तरिक श्रोत	१४२४९ - अन्य दस्तुर	१,००,०००	०	०
२६	आन्तरिक श्रोत	१४२५३ - व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	३,४५,१३३.२३	४३,०००	३,०२,१३३.२३
२७	आन्तरिक श्रोत	१४२६५ - अन्य क्षेत्रको आय	१९,५०,०००	५५,६३४	१८,९४,३६६

क्रमश

२८	आन्तरिक श्रोत	१४३११ - न्यायिक दण्ड, जरिवाना र जफत	२,०५,०००	०	०
२९	आन्तरिक श्रोत	१४३१२ - प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना र जफत	१०,०००	०	०
३०	आन्तरिक श्रोत	१४३१३ - धरौटी सदरस्याहा	५,०००	०	०
३१	आन्तरिक श्रोत	१४५२९ - अन्य राजस्व	११,००,०००	२,७४,५४०	८,२५,४६०
३२	आन्तरिक श्रोत	१५१११ - बेरुजू	१,५०,०००	०	०
३३	आन्तरिक श्रोत	३२१२१ - नगद	५,१०,०००	०	०
जम्मा			१,६२,५६,१३३।२३	३५,४७,७२६.२२	९४,९७,४०७.०१

गापा र वडागत आन्तरिक आम्दानी

गाउँपालिका	वडा नं १	वडा नं २	वडा नं ३	वडा नं ४	वडा नं ५	वडा नं ६	जम्मा
२,९६,४९४	६,३९,९८३	३,५३,१५८	३,११,२८०	३,८९,६२९	२,९०,५७६	२,६९,६०६	३५,४७,७२६.२२

मलेप प्रतिवेदन

- ▶ आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सम्पूर्ण श्रेताहरूको परीक्षण भएको ।
- ▶ ब्यक्तीगत बेरुजु नरहेको ।
- ▶ पुरानो बेरुजु बाट रु ४५ लाख पाँच सय उन्नान्चालिस फछौट ।
- ▶ हाल कायम बेरुजु ५ करोड ५९ लाख ८ हजार रहेको ।

कुनै जिज्ञासा ?



आ.ब ०७८/७९ को अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रम

पूर्वाधार बिकास शाखा

आ.ब ०७६/७७ तथा ०७७/७८ को क्रमागत
योजनाको विवरण

१. गाँउपालिकाको भवनको तल्ला थप र कम्पाउन्ड वाल

- कुल ठेक्का सम्झौता रकम: १,७१,८८,८०४
- निर्माण व्यवसायी: बि.एण्ड बि/स्लेट/जटेश्वर जे.भि
- सम्झौता मिति: २०७७-०८-१८
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०७९-०२-३०
- हालसम्म भएको काम: गाँउपालिका भवनको 1st Floor को ढलान सम्पन्न, तथा finishing को काम अन्तिम चरणमा, कम्पाउन्ड वालको काम सुरु
- हालसम्म भुक्तानी रकम: १,११,९७,७५७।-

२. सानो कुमाले खोला पुल चुलाचुली वडा नं १

- आयोजनाको नाम: सानो कुमाले पक्की पुल निर्माण चुलाचुली वडा नं १
- निर्माण व्यवसायी: माडसुवा/वल्डट्रेड जे.भि
- कुल सम्झौता रकम: ३,३१,८३,४२२।-
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०७९-०३-२०
- हालसम्म भुक्तानी रकम: ८५,९६,७२४।-
- हालसम्म भएको काम: खोलाको दुवै भागमा pile foundation को काम सम्पन्न भएको।
- बाँकी काम: Pile Cap, Abutment, Approach Slab and Girder and Approach Road on either banks.

फोटोहरु



३. १५ सैया अस्पताल निर्माण वडा नं २

- आयोजनाको नाम: १५ सैया अस्पताल निर्माण चुलाचुली गाउँपालिका वडा नं २
- निर्माण व्यवसायी: Kumar/Omsai-Ram J.V
- कुल सम्झौता रकम: १२,९०,१६,२४७।-
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०८०-०१-१७
- हालसम्म भुक्तानी भएको रकम: ३,२३,३२,२७८।-
- हालसम्म भएको काम: Block A को ढलान सम्पन्न, ईटाको गारोको काम अन्तिम चरणमा, प्लास्टरको काम हुँदै Compound Wall को काम सम्पन्न, Block B को Ground Floor को ढलानको सम्पन्न, अपाङ्ग मैत्री Ramp को ढलान हुँदै, Waste management Block को ढलान सम्पन्न
- हालसम्म कामको प्रगति: भौतिक प्रगति अनुमानित ६०%

फोटोहरु







४. सिम्ले आईतवारे कालोपत्रे सडक(क्रमागत)

- आयोजनाको नाम:सिम्ले आईतवारे समावेशी चोक सडक खण्ड (१०० मिटर)
- निर्माण व्यवसायी: रेनेता निर्माण सेवा
- कुल सम्झौता रकम: ९,०९,९४२।-
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०७८-०३-१५
- हालसम्म भुक्तानी रकम:--
- हालसम्म भएको काम:सब-बेस र बेसको, prime coat, tack coat तथा premix carpet को काम सम्पन्न भएको
- बांकी काम:

६. वडा नं १ को कम्पाउन्ड वाल(क्रमागत)

- आयोजनाको नाम: १ नं वडा कार्यालयको कम्पाउन्ड वाल
- निर्माण व्यवसायी: सुम्निमा निर्माण सेवा
- कुल सम्झौता रकम: १४,८६,५४०।-
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०७७-११-२९ , दोस्रो पटक म्याद थप गरि २०७८-०८-३० गते कार्यसम्पन्न भएको।
- हालसम्म भुक्तानी रकम: १४,७९,५३४।-
- हालसम्म भएको काम: कम्पाउन्ड वाल र गेट, वाल मा प्लास्टर तथा ग्रिल
- बांकी काम: छैन.



७.वडा नं ३,४ र ५ को कम्पाउन्ड वालको काम(क्रमागत)

- आयोजनाको नाम:३,४ र ५ नं वडा कार्यालयको कम्पाउन्ड वाल
- निर्माण व्यवसायी: सुम्निमा निर्माण सेवा
- कुल सम्झौता रकम: ४६,१०,९०८।-
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति:२०७७-११-२९ , दोस्रो पटक म्याद थप गरि २०७८-०८-३० गते कार्यसम्पन्न भएको।
- हालसम्म भुक्तानी रकम:४५,३६,३५१।-
- हालसम्म भएको काम:कम्पाउन्ड वाल र गेट, वाल मा प्लास्टर तथा ग्रिल
- बांकी काम: छैन.

०७७/७८(क्रमागत)

- आयोजनाको नाम:किरातेश्वर मा.बि विधालय भवन निर्माण
- निर्माण व्यवसायी: बिज्ञान कन्स्ट्रक्सन
- कुल सम्झौता रकम: ३७,२१,९१९।-
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति:२०७८-०२-३९ , प्रथम पटक म्याद थप गरि २०७८-०५-३०मा कार्यसम्पन्न भएको।
- हालसम्म भुक्तानी रकम:३४,०४,३४४।-
- हालसम्म भएको काम:२ कोठे भवन को सम्पूर्ण काम सम्पन्न, 1st Floor मा column को काम सम्पन्न
- बांकी काम: छैन.

पर्यटन पूर्वाधार
साझेदारी (७०%+३०%)

- आयोजनाको नाम: शिवओरक मिलनपोखरी पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम
- निर्माण व्यवसायी: उमा-काली-जटेस्वर जेभि काठमांडौ
- कुल सम्झौता रकम: ३,९५,१७,०४५।-(मु अ कर र पि एस सहित)
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०८०-११-३० ,
- हालसम्म भुक्तानी रकम: ३५,००,०००।-(मोबिलाईजेसन)
- हालसम्म भएको काम:
- भौतिक प्रगति:-

प्रदेश समपुरक (७०%+३०%) लागत
साझेदारी

- आयोजनाको नाम: गांउपालिका प्रवेश बाटो पश्चिम, ४ नं वडा कार्यालय प्रवेश तथा कमल गांउपालिका सिमाना जोडने सडक कालोपत्रे
- निर्माण व्यवसायी: अग्नि एण्ड सन्स निर्माण सेवा
- कुल सम्झौता रकम: ५५,१५,५९०।-
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०७८-११-३०
- हालसम्म भुक्तानी रकम: ५३,८१,५६६।-
- हालसम्म भएको काम: ३ वटै सडक खण्डको कालोपत्रे सम्पन्न
- बांकी काम: छैन.



प्रदेश समपुरक (७०%+३०%) लागत साझेदारी

- आयोजनाको नाम: हिमाली मार्ग (नर्सरी देखि तिनकुने पोखरी) कालोपत्रे सडक निर्माण (खण्ड -४)-८०० मि
- निर्माण व्यवसायी: पार्वती अम्बिका निर्माण सेवा
- कुल सम्झौता रकम: ५५,६२,९२९।-
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०७८-०३-१५
- हालसम्म भुक्तानी रकम: -१४,६३,०५५।-
- हालसम्म भएको काम: Cross Drainage Structure(Pipe Culvert), Road way Embankment तथा Sub-base को सम्पूर्ण काम सम्पन्न,
- बाँकी काम: Base works, prime coat, tack coat, premix carpet तथा seal coat





तराई मधेष समृद्धि कार्यक्रम

- आयोजनाको नाम:कोलडांडा फुईके नाली तथा Retaining wall निर्माण निर्माण (Drain=300m and Drain with retaining wall=150m)
- निर्माण व्यवसायी: माई भगवती कन्स्ट्रक्सन ईलाम
- कुल सम्झौता रकम: २४,२५,६३३।-
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०७८-११-३०
- हालसम्म भुक्तानी रकम:-९,८५,१२२।१३
- हालसम्म भएको काम: 80m Drain and 120m Drain with retaining wall(कार्य प्रगति: ६०%)
- बांकी काम: Hume Pipes को काम र बांकी नाली तथा रिटेनिङ वाल को काम





तराई मधेष समृद्धि कार्यक्रम

- आयोजनाको नाम:कोलडांडा फुईके नाली निर्माण (Drain=230m)(2nd Package)
- निर्माण व्यवसायी: माई भगवती कन्स्ट्रक्सन ईलाम
- कुल सम्झौता रकम: १२,४६,११६।-
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०७९-०२-३०
- हालसम्म भुक्तानी रकम:-
- हालसम्म भएको काम:
- बांकी काम: २३० मि नाली

तराई मधेष समृद्धि कार्यक्रम

- आयोजनाको नाम:पि.डि.यो टोल हुंदै रमाईलो जनता टोल जाने बाटो
- निर्माण व्यवसायी: अग्नी एण्ड सन्स निर्माण सेवा
- कुल सम्झौता रकम: १२,४६,११६।-
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०७८-११-३०
- हालसम्म भुक्तानी रकम:-१३,२८,५२३।-
- हालसम्म भएको काम:काम सम्पन्न भएको(१८८० मि) ग्रावेल वाटो
- बांकी काम: छैन

तराई मधेष समृद्धि कार्यक्रम

- आयोजनाको नाम:पि.डि.यो टोल हुंदै रमाईलो जनता टोल जाने बाटो (Package 2nd) part-2
- निर्माण व्यवसायी: चन्द्र तुलसा निर्माण सेवा
- कुल सम्झौता रकम: ७,५०,९१२।-
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०७९-०२-३०
- हालसम्म भुक्तानी रकम:--
- हालसम्म भएको काम:भौतिक रुपमा १००% काम सम्पन्न भएको (८०० मि ग्रावेल)तर भुक्तानी हुन बांकी
- बांकी काम: छैन

तराई मधेष समृद्धि कार्यक्रम

- आयोजनाको नाम: दयाचोक जोगि टोल हुंदै छिमेकी टोल जाने बाटो ग्रावेल
- निर्माण व्यवसायी: अग्नी एण्ड सन्स निर्माण सेवा
- कुल सम्झौता रकम: १७,६८,९४०।-
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०७८-११-३०
- हालसम्म भुक्तानी रकम: १७,२०,३१३।३१
- हालसम्म भएको काम: १३०० मि ग्रावेल बाटो, पाईप कल्भर्ट, ग्याबियन जालि तथा Causeway-२ ठाउँ (भौतिक प्रगति १००%)
- बांकी काम: छैन



तराई मधेष समृद्धि कार्यक्रम

- आयोजनाको नाम: दयाचोक जोगि टोल हुँदै छिमेकी टोल जाने बाटो ग्राभेल (दोस्रो प्याकेज)
- निर्माण व्यवसायी: अग्नी एण्ड सन्स निर्माण सेवा
- कुल सम्झौता रकम: ७,२२,२९६।-
- सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति: २०७९-०२-३०
- हालसम्म भुक्तानी रकम: ७,२०,६६८।८०
- हालसम्म भएको काम: ३८० मि ग्राभेल बाटो, तथा hume पाईप (भौतिक प्रगति १००%)
- बाँकी काम: छैन

परामर्श सेवा खरिद

बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR)

- कार्यक्रमको नाम: फुईके तोरिवारी खण्डमा मावाखोला पुलको DPR
- परामर्शदाता: Design Associates Nepal, Kathmandu
- कुल सम्झौता रकम: १४,९२,११९।-
- हालसम्म भएको काम: यस कार्यालयले तयार गरेको कार्यक्षेत्र (TOR) तथा सम्झौता अनुरूपको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको।

परामर्श सेवा खरिद बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR)

- कार्यक्रमको नाम:पन्चकन्या आ.बि र बांझोगाँउ मा.बि भवन निर्माण DPR
- परामर्शदाता: Design Associates Nepal, Kathmandu
- कुल सम्झौता रकम: १४,९२,११९।-
- हालसम्म भएको काम: यस कार्यालयले तयार गरेको कार्यक्षेत्र (TOR) तथा सम्झौता अनुरूपको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएको।

परामर्श सेवा खरिद प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (IEE)

- कार्यक्रमको नाम:नुनसरी, रतुवा, विधुवा, चांजु र कमल खोला वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन (IEE) को पुनःमुल्यांकन
- परामर्शदाता: Bajju Builders Kathmandu
- कुल सम्झौता रकम: ४,९४,३७५।-
- हालसम्म भएको काम: IEE प्रतिवेदन तयार भई यस कार्यालयबाट स्वीकृत भएको, प्राकृतिक श्रोत जिल्ला अनुगमन समितिबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण बिकास समिति समक्ष सिफारिस भई ठेक्का प्रकृया अगाडी वढाईएको।

नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न आय ठेक्का

- ठेक्काको नाम:रतुवा र मावा खोलाको नदिजन्य पदार्थको उत्खन्न
- निर्माण ब्यवसायी: अग्नी एण्ड सन्स निर्माण सेवा
- कुल सम्झौता रकम:कबोल अंकमा रु ८५,८८,०००।-(मु अ कर सहित) मा निर्माण ब्यवसायीले एकमुष्ट रकम बुझाउदा पाउने १० % छुट सहित रु ६८,४०,०००।- मा सम्झौता भएको।
- हालसम्म भएको काम: रतुवा खोलाको झोलुङ्गे पुलको १ कि मि दक्षिण, खरायो कटेज पुर्व तथा कमल गाँउपालिकाको सिमानाभित्र स्वीकृत IEE परिमाण २८००० घ मि नदिजन्य पदार्थको उत्खन्न भईसकेको र उक्त क्षेत्रमा उत्खन्न कार्य बन्द गरिएको।
- बाँकी काम: मावा खोलामा १३,६२५ घ मि नदिजन्य पदार्थको उत्खन्न गर्न बाँकी








WELCOME & NAMASTE

Half Yearly Review Workshop

Fiscal Year : 2078/79

Dushyant Dahal
Public Health Inspector
Chulachuli RURAL Municipality
Health Section

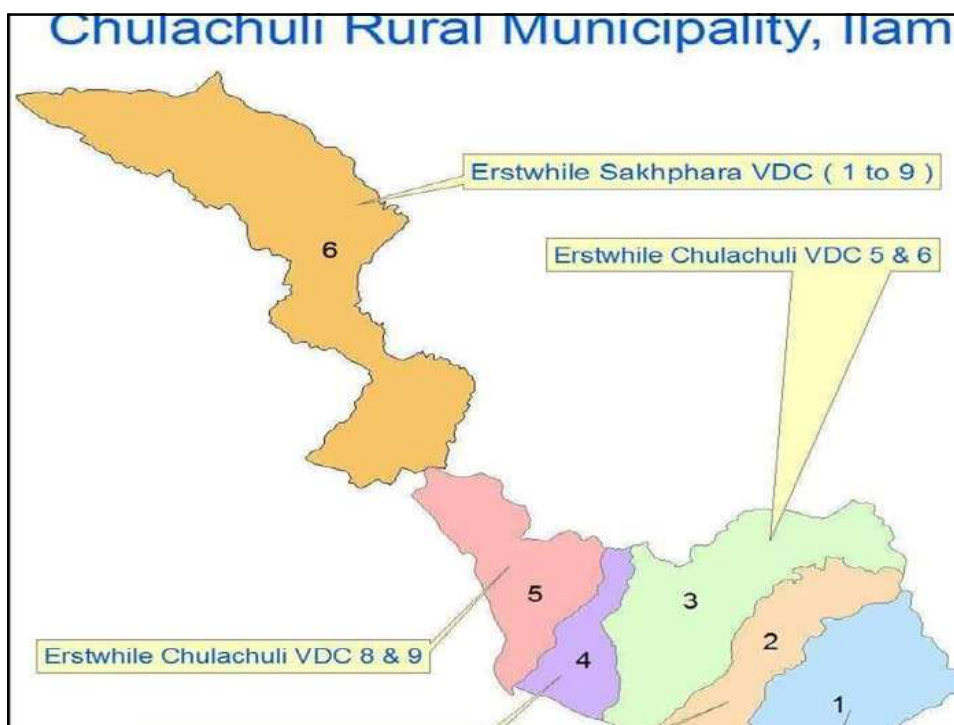



PRESENTATION OUTLINE



- Target Population
- Service outlets
- Human resource
- Financial resource
- Physical Infrastructure
- Reporting status
- Progress of annual programs
- Medical Equipment
- Innovation
- External Development Partner
- Issues and Way forward

3



TARGET POPULATION



POPULATION	TOTAL NUMBER
Total population	24410
Under 1 year	400
Under 2 year	1823
12-23 months	399
6-59 months	1823
12-59 months	1823
Under 5 years	1823
Female pop 15-49 years	7389
MWRA 15-49 years	6064
Expected live birth	408

4



SERVICE OUTLETS



SERVICE OUTLET	TOTAL NUMBER
EPI clinic	10
PHC /ORC	6
Birthing center	2
DOSTS center/sub-center	3
Safe aboration sites	2
Adolescent friendly health center	7
FCHV	75
Private hospital/ clinics	7
Health post	2
Ambulance private	1
BASIC HEALTH UNIT	3
COMMUNITY HEALTH UNIT	2

5



HUMAN RESOURCE





Categories	Sanctioned post (Number)	Fulfilled		Filled in contract (Karar) (Number)	Recruited using local resources (Number)
		Number	%		
Health section	1	1	100	0	
HA	3	2	66	2	
Staff Nurse	0	0	0	0	
Sr.AHW/AHW	2	2	100	3	
Sr.ANM/ANM	2	2	100	8	
Lab staff	0	0	0	1	
Others (office assistant)	0				
Total	7	7		14	

6

 FINANCIAL RESOURCE 			
Budget	Budget Allocated	Budget Expenditure	Budget Expenditure (%)
Centre	14000000	4800000	34
Local	5000000	2450000	49
Total	19000000	6450000	41.5
7			

 PHYSICAL INFRASTRUCTURE AND OTHER RESOURCES 		
क स	विवरण	संख्या
१	आफनै स्वामित्वमा जग्गाधनि पर्जा भएका स्वास्थ्य संस्था	९
	आफनै भवन भएका स्वास्थ्य संस्था	९
३	खानेपानीको नियमित उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था	९
४	स्वास्थ्यजन्य फोहोरमहिलाको उचित व्यवस्थापन गरेका स्वास्थ्य संस्था	९
५	टेलिफोनको उपलब्धता (landline ,mobile)भएका स्वास्थ्य संस्था	९
६	विद्युतको उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था	८
७	सोलार ब्याकप भएका स्वास्थ्य संस्था	५
८	इन्टरनेट सुविधा भएका स्वास्थ्य संस्था	८
९	एम्बुलेन्स सेवा उपलब्धता भएका स्वास्थ्य संस्था	
१०	अस्पताल निर्माणाधिन	१

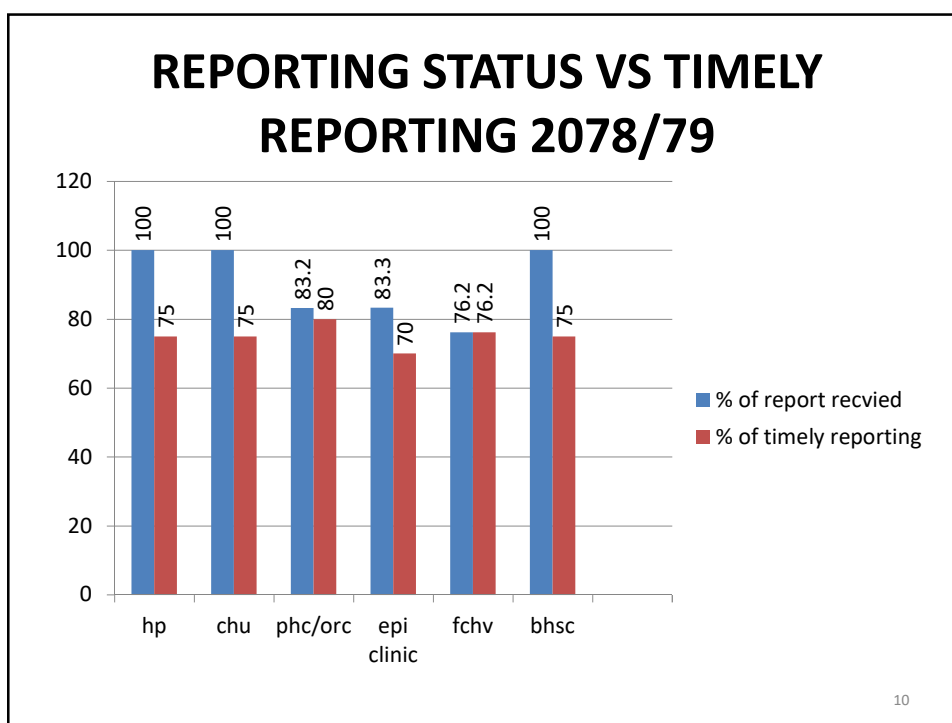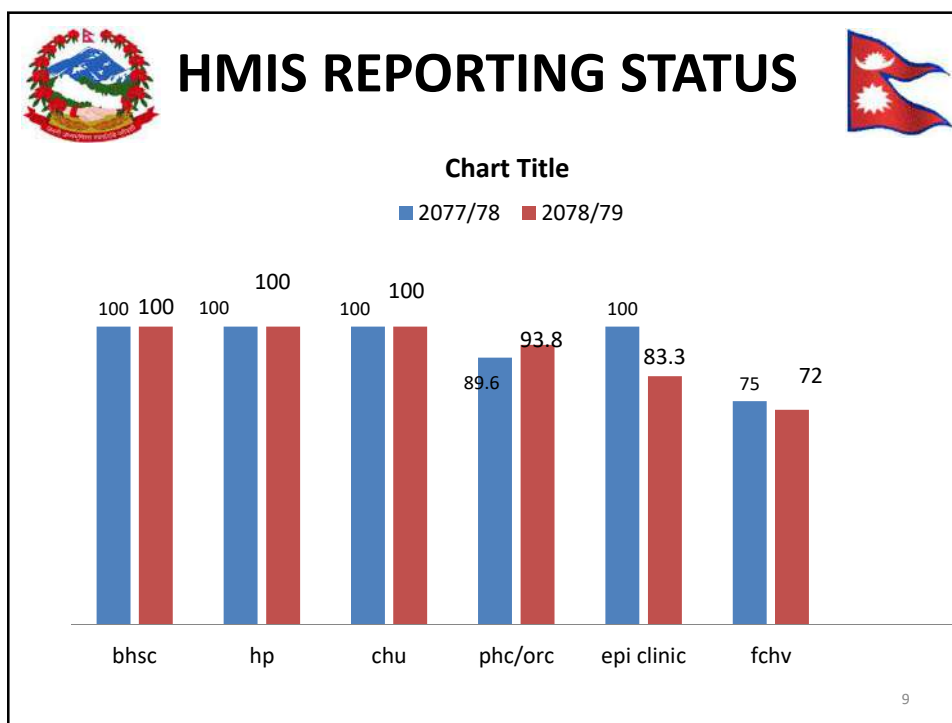



KEY ISSUES AND RECOMMENDATIONS IN RECORDING & REPORTING



- Hmis tools
- Recording reporting
- Manpower(MR-CO)
- Dhis 2
- Work load in palika and HF
- Laptop ,Computer ,Printer Internet, in health Facility


11



PROGRESS OF ANNUAL PROGRAM

12








CHILDREN FULLY IMMUNIZED AS PER NIP SCHEDULE

	2077/78	2078/79
No . Of fully immunized as per NIP schedule	136	140

16






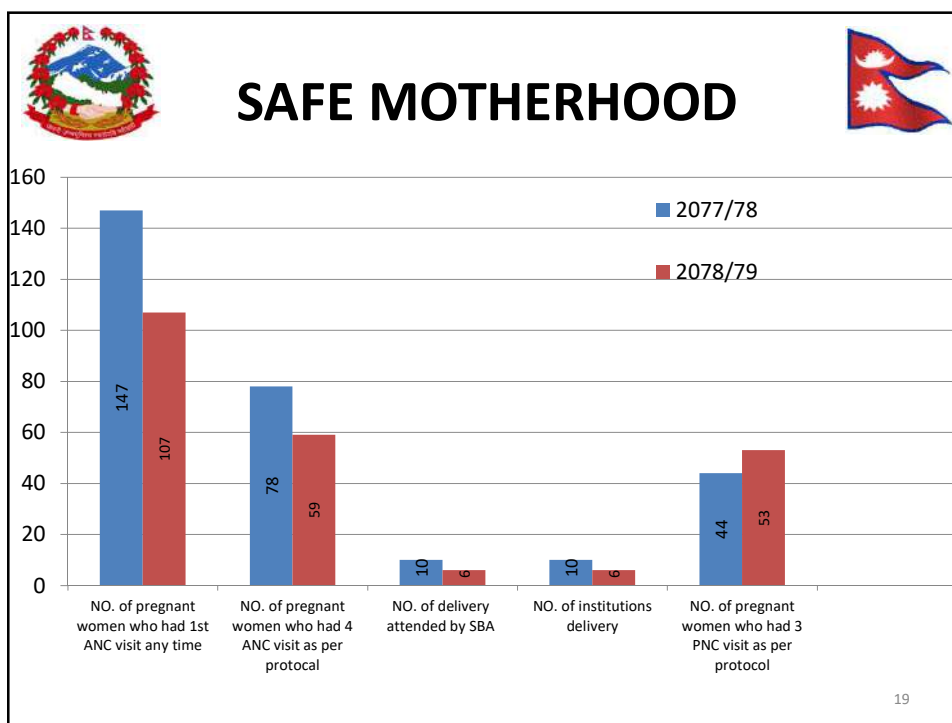



MATERNAL AND NEONATAL MORTALITY

	Facility Death	Community Death (home or way)
Total Maternal Deaths		
Total neonatal deaths		
Total still births		

20







MALARIA, TB, LEPROSY PROGRAMME: KEY ISSUES AND RECOMMENDATION

- Laboratory
- Manpower
- Training

26



CURATIVE SERVICE



Indicator	2077/78	2078/79
Total number of OPD new visit	7388	9007
% of OPD new visits among total population		
Proportion of female patients among total new OPD visits	4278	5347

27



TOP TEN MORBIDITY



S.N	Disease	Number	Percentage
1	APD (gastitis)	675	
2	Fungal inf^n	523	
3	Ful injury	504	
4	headache	472	
5	Viral influenza	462	
6	Urticaria	402	
7	URTI	379	
8	DARMATITIS/ECZEMA	302	
9	TONSILITIS	271	
10	HTN	257	
11	CONJUNTIVITIS	246	
12	BACKACHE/MUSKULOSKELETAL PAIN	200	




COVID 19



Indicator	Number
Total number of test performed (Antigen) (PCR)	250
Total number of positive cases	103
Total number of cured cases	246
Total number people in Home Isolation	240
No. of isolation beds	15
Total number of people isolated (Hospital)	10
No. of fever clinic	2
Total number of people served from fever clinic	
No. of CICT team	1
Total number of contacts traced	
Deaths	4

29

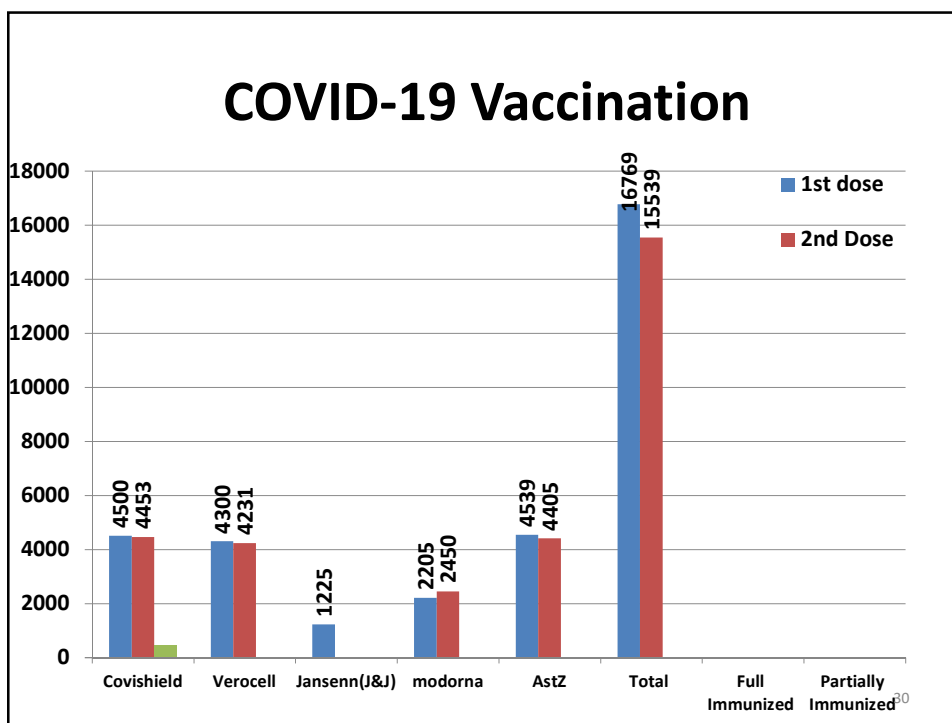



INNOVATIONS/INITIATIVES



S.N.	Innovative Interventions Undertaken	Outcomes
1	Prevention and Control of COVID-19	Screening , Quarantine , Isolation , Prevention and control of Community transmission , CICT, Mass Vaccination, Covid-19 Hospital , Fever Clinics, Hazard Allowance
2	DHIS-2 , LMIS,	Online reporting
3	Calcium + Folic Acid Programe	Service Utilization of Pregnant and PPM,s

31



INNOVATIONS/INITIATIVES




S.N	Innovative Interventions Undertaken	Outcomes
4	Comprehensive Nutrition Training Package for Health Care Providers and fchv	Uniformity of Treatment in Nutrition Counseling , Management, Treatment and Referral
4	Auto carbon OPD Tools	Recording and Reporting
5	Medicine Store Management	Easy Distributing Medicine and other logistics
6	Renovation Infrastructure	Service Utilization in Health Facilities

32

 EXTERNAL DEVELOPMENT PARTNERS 		
S.N.	Organization	Program
1	Karuna Founadtion Nepal , Ilam	I2C (Disability Prevention and Rehabilitation)
2	One Heart Worldwide	MCH (BC, NM, MSC)
3	IPASS	Safe Abortion
4	Sewa Canada international	Covoid-19 preventions
5	Beldangi rufuge camp	Covid -19 (oxygen cyclinder)

33

THREE HIGH PRIORITY HEALTH ISSUES OF PALIKA			
Rank	Issue/Challenges	Impacts	Recommendation
1.	COMMUNITY HOSPITAL	HEALTH SERVICE	Follow up
2.	HUMAN RESOURCE STRENGTHENING	QUALITY HEALYH SERVICE	TRAININGS
3.	BUDGETING	QUALITY HEALTH SERVICE	PAALIKA FOCUS ON SOCIAL DEVELOPMENT









मुकीकृत स्वास्थ्य सेवा शिविर

आँखा, दन्त तथा अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू

स्थान: चुलाचुली-६, फुडनाम, २०७८ माघ ५ गते
चुलाचुली-९, कमल, २०७८ माघ ७ गते

सहजकर्ता	प्राविधिक सहयोग	आयोजक
१) मेची नेत्रालय, दमक-६	२) आमा डेण्टल हस्पिटल, दमक	चुलाचुली गाउँपालिका इलाम
३) लाइफलाइन अस्पताल, दमक	४) दमक अस्पताल, दमक	
५) नागरिक सम्मान प्रतिष्ठान, नेपाल		
६) चेलीम कार्यालय, दमक-५, कापा		



आ.व. २०७८/०७९ मा सञ्चालित योजना तथा
कार्यक्रमहरुको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम

२०७८ फागुन ३० गते
सोमबार

आयोजक
चुलाचुली गाउँपालिकाको कार्यालय
चुलाचुली, ईलाम

चालू खर्चतर्फ

शिक्षा शाखा				
क्र.सं.	शीर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत
१	सञ्चार महशुल र इन्टरनेट सेवा शुल्क समेत शिक्षा	२४,०००	०	०
२	इन्धन कार्यालय प्रयोजन	३०,०००	०	०
३	सवारी साधन मर्मत	५०,०००	७,२५०	१४.५
४	मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	५०,०००	११,०००	२२
५	अनुगमन, मूल्याङ्कन खर्च	३०,०००	०	०
६	भ्रमण खर्च	२०,०००	१८,४००	९२
७	विविध खर्च	२०,०००	०	०
८	प्रिन्टर खरिद	३०,०००	०	०
९	घर्निचर तथा फिक्चर्स	१६,०००	०	०
	जम्मा	२,७०,०००	३६,६५०	१३.५७

गाउँपालिकातर्फ

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
शैक्षिक सुधार कार्यक्रम				
१	श्री भानु मा.वि., चुलाचुली-५, (शिक्षक व्यवस्थापन)	४,७६,०००	३,३०,७४७	६९.४८
२	श्री जनता मा.वि., चुलाचुली-२, (शिक्षक व्यवस्थापन)	५,००,०००	९६,८९६.५०	१९.३
३	श्री किरातेश्वर मा.वि., चुलाचुली-३, (शिक्षक व्यवस्थापन)	४,५०,०००	२,८०,०००	६२.२२
४	श्री बालज्योती मा.वि., चुलाचुली-४, (शिक्षक व्यवस्थापन)	२,६०,०००	१,४०,०००	५३.८
५	श्री बाँभोगाउँ मा.वि., चुलाचुली-५, (शिक्षक व्यवस्थापन)	५,२०,०००	२,८०,०००	५३.८
६	श्री राष्ट्रप्रेमी उ.मा.वि., चुलाचुली-६, (शिक्षक व्यवस्थापन)	५,२०,०००	२,८०,०००	५३.८

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
शैक्षिक सुधार कार्यक्रम				
७	श्री जनता मा.वि., चुलाचुली-१, (शिक्षक व्यवस्थापन)	३,२५,०००	२,३५,०००	७२.३
८	श्री मिक्लाजोड मा.वि., चुलाचुली-६, (शैक्षिक सुधार)	२,६०,०००	१,४०,०००	५३.८
९	श्री शीवज्योती आ.वि. चुलाचुली -१, (शिक्षक व्यवस्थापन)	१,९५,०००	१,०५,०००	५३.८
१०	श्री पञ्चकन्या आ.वि. चुलाचुली -२, (शिक्षक व्यवस्थापन)	५,२५,०००	२,१०,०००	४०
११	श्री गिताञ्जली आ.वि. चुलाचुली -६, (शिक्षक व्यवस्थापन)	१,९५,०००	१,०५,०००	५३.८
१२	सूर्योदय आ.वि. चुलाचुली ३ (शिक्षक व्यवस्थापन)	१,९५,०००	१,०५,०००	५३.८

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
शैक्षिक सुधार कार्यक्रम				
१३	बाल बिकास सहजकर्ता थप तलब	१९,११,०००	१३,३९,२९९. ९९	७०.०८
१४	मातृ भाषा शिक्षक व्यवस्थापन	७,८०,०००	२,७५,२५८. ०६	३५.२८
१५	विद्यालय कर्मचारी थप तलब	२५,३४,५००	१०,२९,०० ०	४०.५
१६	विद्यालय सह लेखापाल थप तलब	११,९६,०००	७३,५००	६.१४
१७	श्री सिरानतला बालविकास सहजकर्ता व्यवस्थापन	१,९५,०००	०	०
१८	गाउँपालिका द्वारा व्यवस्थापन गरिएका शक्षिक तथा सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई पोशाक भत्ता	२,५०,०००	०	०

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
शैक्षिक सुधार कार्यक्रम				
१९	प्रअ बैठक व्यवस्थापन	६७,५००	५०,०००	७४.०५
२०	कक्षा ५ र ८ को परीक्षा व्यवस्थापन	१,८०,०००	०	०
२१	राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड प्रतियोगिता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन	१,००,०००	०	०
	जम्मा	१,१६,३५,०००	५०,३४,७०१. ५५	४३.२७

शसर्त अनुदनतर्फ

क्र.सं. ढघ	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
१	आधारभूत तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत)	६,७४,००,०००	३,४८,९२,७२४.४५	५१.७७
२	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरबन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तर्गतका शिक्षक/कर्मचारीहरु, प्राविधिक धारका प्रशिक्षकसमेत)	१,१८,००,०००	६५,३७,७९३	५५.४१
३	प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान	५३,०३,०००	३२,९९,२९९.९९	६२.२१
४	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान	१२,७२,०००	१०,२०,०००	८०.१८

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
५	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान	२४,२५,०००	०	०
६	कोभिड १९ का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा सिकाइ सहजीकरणका लागि शैक्षिक कार्यक्रम	४,००,०००	१,४८,०२९.१०	३७
७	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, औपचारिक तथा बैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, बैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रमसमेत)	४,००,०००	०	०
८	तोकिएको विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान	७०,२१,०००	४,४१,७९५	६.२९

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
९	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानीटरी प्याड व्यवस्थापन	९,८३,०००	०	०
१०	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान	२६,९२,०००	०	०
११	प्रतिविद्यार्थी शैक्षिक लागतका आधारमा शिक्षण सिकाइ सामाग्री एवम् कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापन अनुदान	११,९१,०००	०	०
१२	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)	८,११,०००	०	०

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
१३	माध्यमिक तह कक्षा ९-१० मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	८,६४,०००	६,४४,२२०.९६	७४.५
१४	आधारभूत तह कक्षा ६-८ मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान	३,३८,०००	७१,९५८.६	२१.२८
१५	केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना विद्यालय, विशेष विद्यालयको क्रमागत भवन निर्माण तथा कक्षा ११ स्तोनिति भएका प्राविधिक धार विद्यालयको ल्याव व्यवस्थापन अनुदान	१,५०,००,०००	०	०
	जम्मा	११,७०,००,०००	४,७०,५५,८२१.१	४०.२

खेलकुद तर्फ

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
१	आधारभूत तह स्तरीय अन्तर विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता	१०००००	०	०
२	किराँतेश्वर मावि खेलमैदान व्यवस्थापन	२०००००	०	०
३	खेलाडीहरुलाई अन्य प्रतियोगितामा सहभागी गराउन	१५००००	१७०००	४.६
४	गाउँपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीहरुलाई सहकारी शिक्षा तालिम	५००००	०	०
५	टेबलटेनिस बोर्ड खरिद तथा खेल सन्चालन	५००००	०	०
६	ब्याडमिन्टन खेलमैदान व्यवस्थापन	५००००	०	०
७	मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा सामग्री खरिद	२५००००	०	०

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
८	शिक्षक कर्मचारी मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता	५००००	०	०
९	शिक्षक कर्मचारी मैत्रीपूर्ण भलिबल प्रतियोगिता	३००००	०	०
१०	खेलकुद सामग्री खरिद	५००००	०	०
११	दोस्रो चुलाचुली गोल्डकप प्रतियोगिता	५७००००	०	०
	जम्मा	१५५००००	१७०००	१.०९

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ र चुलाचुली गाउँपालिकाको संयुक्त रुपमा सञ्चालित विद्यालय सुपरिवेक्षणको क्रममा



धन्यवाद !!!!!

**आ.व. २०७८/०७९ मा कृषि विकास शाखाबाट
सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको अर्धवार्षिक
समीक्षा कार्यक्रम**

२०७८ फागुन ३० गते

**आयोजक
चुलाचुली गाउँपालिकाको कार्यालय
चुलाचुली, ईलाम**

कृषि शाखा प्रशासनिक खर्च				
क्र.सं.	शीर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत
१	खाने पानी	५,०००	०	०.००
२	इन्धन कार्यालय	३५,०००	०	०.००
३	सवारी साधन मर्मत	३०,०००	९,३५०	३१.१७
४	मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२५,०००	०	०.००
५	फर्निचर तथा फिक्चर्स	४,५००	०	०.००
६	विविध	५,०००	०	०.००
७	अनुगमन मुल्याङ्कन खर्च	२७,०००	०	०.००
८	भ्रमण खर्च	४८,०००	८,६००	१७.९२
९	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	०,०००	०	०.००
	जम्मा	२७०,०००	१७,९५०	६.६४

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
कृषी तर्फ कार्यक्रमतर्फ				
१	कृषि उपकरण चिस्यान मिटर जडान,डिजिटल तराजु खरिद	५०,०००	०	०.००
२	२५% अनुदानमा आलुको बिउ वितरण कार्यक्रम	९,००,०००	६,७५,०००	७५.००
३	निशुल्क तरकारी तथा च्याउको बिउ किट वितरण कार्यक्रम	३,००,०००	९५,०००	३१.६७
४	५०% लागत सहभागीतामा प्लाष्टिक टनेल वितरण	५००,०००	०	०.००
५	अध्यक्ष उपाध्यक्ष मैत्री कृषि कार्यक्रम	५००,०००	०	०.००
६	कृषि तालिम गोष्ठी सञ्चालन ५ वटा	५०,०००	०	०
७	कृषि सामाग्री ढ'वानी	१००,०००	६१,५००	६१.५०

८	राष्ट्रिय धान दिवस	१,७५,०००	०	०.००
९	बेमौसमी तरकारी खेति कार्यक्रम	१००,०००	९०,०००	९०
१०	बाली संरक्षण जैविक बिषादी र निश'ल्क सामाग्री वितरण कार्यक्रम	५००,०००	९५,०००	१९
११	आकस्मिक रोग किरा नियन्त्रण	३००,०००	९५,०००	३१.६७
१२	सिमल तरुल संरक्षण कार्यक्रम	१,५०,०००	०	०.००
१३	चुलाचुलीको तरकारी खाउँ वर्षभरी (एक घर एक कृषि कार्यक्रम)	६००,०००	०	०.००
१४	५०%अनुदानमा माछाको भुरा वितरण	५००,०००	०	०.००

१५	निशुल्क सुक्ष्म जैविक तत्व वितरण कार्यक्रम	५००,०००	०	०.००
१६	कोभिड बाट संक्रमितका लागी मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम	६००,०००	०	०.००
१७	सुचना सञ्चार बुकलेट पम्पलेट छपाई तथा प्रकाशन कार्यक्रम	५०,०००	०	०.००
१८	सुचना पत्रपत्रिका र विज्ञापन प्रकाशन	२५,०००	०	०.००
	जम्मा	५९,००,०००	११,११,५००	१९

शसर्त अनुदानतर्फ				
१	खाद्यान्य बालीको उन्नत विउ उपयोगमा मूल्य अनुदान	१३,५०,०००	१३,५०,०००	१००

आ.व. २०७८/०७९ मा पशु सेवा शाखाबाट
सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमहरूको अर्धवार्षिक
समीक्षा कार्यक्रम

२०७८ फाल्गुण ३० गते

आयोजक
चुलाचुली गाउँपालिकाको कार्यालय
चुलाचुली, ईलाम

पशु सेवा शाखा

प्रशासनिक खर्च तर्फ :				
क्र.सं.	शीर्षक	विनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत
१	पानी विजुली	५,०००		
२	सञ्चार महशुल	१५,०००		
३	सवारी साधन इन्धन	३०,०००	१६,२९६.८९	५४.३२
४	सवारी साधन मर्मत	३०,०००	१६,९००	५६.३३
५	मेसिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन	२५,०००		
६	कार्यालय सञ्चालन	४०,०००		
७	अनुगमन/भ्रमण खर्च	७५,०००	४,६००	६.१३
८	फर्निचर तथा फिक्चर्स	५०,०००		
	जम्मा	२७०,०००	३७,७९६.८९	१३.९९

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
कार्यक्रम तर्फ				
१	व्यवसायिक कर्गहरूको पालन फर्महरूलाई प्रबर्द्धनका लागि अनर्गदान	६५०,०००	०	०
२	७५ प्रतिशत अनर्गदानमा कर्गटी काट्ने च्यापकटर मेशिन वितरण	४००,०००	४००,०००	१००
३	५० प्रतिशत अनर्गदानमा दाना पिस्ने मेसिन वितरण कार्यक्रम	१५०,०००		
४	स्थलगत पशुपालन तालिम (१ दिने) -५ पटक	१००,०००	०	०
५	पशु विमा अन्तरक्रिया गोष्ठी- २ पटक	१००,०००	०	०




६	पशु स्वास्थ्य शिविर (१ दिने)	३००,०००	०	०
७	पशु विमा अनुरोध कार्यक्रम	२००,०००	०	०
८	कृत्रिम गर्भाधानको लागि लिक्विड नाइट्रोजन खरिद तथा ढाँचानी	१००,०००	४२,०००	४२
९	कृत्रिम गर्भाधान कर्ताको लागि लजिस्टिक सपोर्ट (रेनकोट,भोला, एप्रोन आदि खरिद ।	५०,०००	०	०
१०	मदर कन्टेनर dry shipper खरिद	२००,०००	०	०
११	७५ प्रतिशत अनुदानमा व्यवसायिक गाई फर्महरुलाई काउम्याट वितरण	४००,०००	०	०

१२	नश्ल संधारको लागि बोयर जातको बोका खरिद वितरण कार्यक्रम	६००,०००	०	०
१३	रोग निदान तथा परजिबी नियन्त्रण	३००,०००	९९,९३६	३३.३१
१४	मेडिकल उपचार सेवा	१५०,०००	५०,०००	३३.३३
१५	माइनर सर्जिकल सेवा	७५,०००	२५,०००	३३.३३
१६	गाइनोक्लोजिकल सेवा	७५,०००	२५,०००	३३.३३

१७	खोप सञ्चालन (रेविज, पि.पि.आर. खोरेत)	७५,०००	२५,०००	३३.३३
१८	अन्य औषधी खरिद	४००,०००	१५०,०००	३७.५०
१९	पत्रपत्रिका र एफ्.एम्. टेलिभिजनबाट सूचना प्रशारण/प्रकाशन)	२५,०००	१०,०००	४०
२०	हिउँदो घाँस (जै) वितरण कार्यक्रम	३२५,०००	३२५,०००	१००
२१	मोटर साइकल खरिद	३२५,०००	३२५,०००	१००
	जम्मा	५०,००,०००	१४,७६,९३६	२९.५३

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
पशु सेवा शाखा (शसर्त)				

???



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित वजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
सञ्चालित कार्यक्रमहरू				
१	एम.आई.एस अपरेटर तथा फिल्ड सहायकको तलब	५,२०,०००	२१६०६०	४१.५५%
२	मसलन्द सामग्री खरिद तथा सेवा इकाइ सञ्चालनार्थ	१२००००	८११५०.९५	६७.६३%
३	मेसिनरी औजार तथा फर्निचर मर्मत	६००००	१६,८००	२८%
४	सञ्चार खर्च	५,०००	१,२००	२४%
५	सञ्चार सामग्री तथा प्रसारण	१४००००	१००००	७.१४%
६	दैनिक भ्रमण भत्ता	१०८०००	४१००	३.८०%
जम्मा				

आ.व. २०७८।०८९ को दोस्रो त्रैमासिक सम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहिहरूको विवरण

	पहिलो त्रैमासिक			दोस्रो त्रैमासिक		
	संख्या	मासिक दर	जम्मा रकम	संख्या	दर	जम्मा रकम
जेष्ठ नागरिक भत्ता(७० वर्ष माथि)	१११५	४०००	१३१७४८२५	११११	४०००	१३१७३३४६
जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)	१०५	२६६०	८२७२६०	१०६	२६६०	८४५८८०
जेष्ठ नागरिक एकल महिला	१९९	२६६०	१५७९९५७	२०२	२६६०	१५९१४७८
विधवा	२०६	२६६०	१६१९९४०	२१७	२६६०	१६९१७७०
पूर्ण अपाङ्गता भत्ता	४२	३९९०	४९७१५४	४१	३९९०	४८५१८४
अति अशक्त अपाङ्गता भत्ता	१६२	२१२८	१०३२०८०	१६१	२१२८	१०२७८२४
दलित बालबालिका	११३	५३२	१६७९९१	१११	५३२	१६३१५१
जम्मा	१९४२		१८८९९२०७	१९४९		१८९७८६२३

धन्यवाद



**चालू आ.व. २०७८/०७९ मा हालसम्म
सामाजिक विकास शाखा अन्तर्गत महिला
बालबालिका तथा समाजकल्याण
उपशाखाद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको
समिक्षात्मक विवरण**

बालबालिका लक्षित कार्यक्रमतर्फ			
बालक्लव परिचालन पालिकास्तरीय बाल सञ्जाल गठन, बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि प्रचारप्रसार, बालमैत्री स्थानीय शासन अनुगमन तथा घोषणा कार्यक्रम			
क्र.सं	शीर्षक	विनियोजित बजेट	कैफियत
१	बाल दिवस मनाउने	५००००	अन्तर बालक्लव निबन्ध प्रतियोगिता सञ्चालन भएको
२	अनुरोध पत्र, फ्लेक्स छपाइ, एक्रेल बोर्ड तयारी तथा वितरण	३०००००	
३	बालमैत्री स्थानीय शासनको प्रचारका लागि स्थानीय सहजकर्ता नियुक्ति तालिम र पारिश्रमिक	१०००००	प्रत्येक वडामा २/२ जना सहजकर्ताहरू नियुक्त भइ परिचालित भएका । ३ र ५ को हकमा सम्पन्न समेत भइसकेको

बालबालिका लक्षित कार्यक्रमतर्फ

बालक्लव परिचालन पालिकास्तरीय बाल सञ्जाल गठन, बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि प्रचारप्रसार, बालमैत्री स्थानीय शासन अनुगमन तथा घोषणा कार्यक्रम

क्र.सं	शीर्षक	विनियोजित बजेट	खर्च प्रतिशत
४	गाउँस्तरीय बाल सञ्जाल गठन र अभिमुखीकरण	८००००	
५	जिङ्गल निर्माण र प्रचारप्रसार	५००००	
६	विज्ञका लागि यातायात खर्च पारिश्रमिक (सूचक प्रमाणीकरण, प्रतिवेदन तयारी, डकुमेन्टेशन समेत)	१०००००	
७	बालमैत्री गतिविधि सञ्चालनका लागि विद्यालयलाई अनुदान	१२१०००	
८	बालक्लव तालिम	५००००	

बालबालिका लक्षित कार्यक्रमतर्फ

बालक्लव परिचालन पालिकास्तरीय बाल सञ्जाल गठन, बालमैत्री स्थानीय शासनका लागि प्रचारप्रसार, बालमैत्री स्थानीय शासन अनुगमन तथा घोषणा कार्यक्रम

क्र.सं	शीर्षक	विनियोजित बजेट	कैफियत
९	गाउँस्तरीय बाल सञ्जाल गठन र अभिमुखीकरण	८००००	
१०	जिङ्गल निर्माण र प्रचारप्रसार	५००००	
११	नियमित अनुगमन	१०००००	निरन्तर भइरहेको

बालबालिका लक्षित कार्यक्रमतर्फ				
बालबालिका लक्षिततर्फ तोकिएका हुन बाँकी कार्यक्रमहरू				
क्र.सं	शीर्षक	विनियोजित बजेट	खर्च भएको रकम	कैफियत
१२	बाल उद्यान निर्माण	२५००००	०	कार्यान्वयनको क्रममा रहेको
१३	रणनीति पत्र तयारी	५००००	०	०
१४	बाल क्लव एवम् बाल सञ्जाल सञ्चालन तथा परिचालन खर्च अनुदान	१५००००		०

**बालमैत्री अभियान तथा
बालबालिका लक्षित विभिन्न
कार्यक्रमहरूको झलक**





बालदिवसको अवसरमा आयोजित निबन्ध प्रतियोगिता विजयीहरूलाई पुरस्कार र प्रमाण पत्र वितरण गर्नुहुँदै गापा अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू तथा नि.प्र.प्र.अ.





अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रमहरू			
हेरचाहका लागि उत्प्रेरणा कार्यक्रमतर्फ सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू			
क्र.सं	शीर्षक	विनियोजित बजेट	कैफियत
१	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम	४५००००।-	१०९ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वास्थ्य विमामा आवद्ध भएका
२	अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाउने	३६०००।-	प्रत्येक वडामा मनाइएको
३	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा प्रारम्भिक स्वास्थ्य जाँच शिविर तथा परिचय पत्र वितरण	६००००।-	४४ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले नयाँ परिचय पत्र पाएका ।
४	सि.बि. आर. एफ. त्रैमासिक बैठक	२४००।-	निरन्तर सञ्चालन भइरहेको

अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रमहरू			
हेरचाहका लागि उत्प्रेरणा कार्यक्रमतर्फ सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू			
क्र. सं	शीर्षक	विनियोजित बजेट	कैफियत
१	अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई पोषण सहयोग	२४०००	प्रत्येक वडामा वडा कार्यालयको सिफारिसमा २/२ जना बालबालिकाहरूलाई पोषण सहयोग उपलब्ध गराइएको
३	मिलिजुली समुहको बैठक	८६४००।-	निरन्तर भइरहेको । प्रत्येक महिना प्रत्येक वडामा
६	सहयोगी सामग्रीका लागि सहयोग		वडा नं १ देखि ६ सम्मका १० जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ह्वील चियर वितरण गरिएको
७	समावेशी बालकलवको बैठक	२१६००।-	पहिलो चौमासिकको बैठक सञ्चालन भइसकेको दोस्रो चौमासिक बैठक कार्यान्वयनको क्रममा रहेको ।
५	सुनौला हजार दिनका आमाहरूका लागि पोषण सम्बन्धी शिक्षा		

अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रमहरू			
हेरचाहका लागि उत्प्रेरणा कार्यक्रमतर्फ सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरू			
क्र. सं.	शीर्षक	विनियोजित बजेट	कैफियत
१	सुनौला हजार दिनका आमाहरूलाई पोषण सम्बन्धी शिक्षा		प्रत्येक वडामा सम्पन्न भइसकेको
२	स्वास्थ्य उपचारका लागि सहयोग		६ नं वडामा १ जना व्यक्तिलाई उपलब्ध गराइएको

अपाङ्ग परिचय पत्र वितरण सम्बन्धि विवरण					
वडा नं.	क वर्ग	ख वर्ग	ग वर्ग	घ वर्ग	कैफियत
१	४	७+५	२	२	५ जनाको पहेंलोबाट निलोमा कार्ड परिवर्तन भएको
२	-	-	३	२	
३	१	४+३	-	-	३ जनाको पहेंलोबाट निलोमा कार्ड परिवर्तन भएको
४	-	२		१	
५	१	२	३	-	
६	१	१	-	-	निलोबाट रातोमा परिवर्तन भएको
जम्मा	७	२४	८	५	४४

अपाङ्ग परिचय पत्र नवीकरण सम्बन्धि विवरण					
वडा नं	क वर्ग	ख वर्ग	ग वर्ग	घ वर्ग	जम्मा
१	-	-	२	-	२
२	-	-	४	-	४
३	२	-	-	-	२
४	-	-	-	-	०
५	-	-	२	१	३
६	-	१	-	-	१
जम्मा	२	१	८	१	१२

अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम तर्फ सञ्चालन हुन बाँकी कार्यक्रमहरू		
क्र.सं.	कार्यक्रम शीर्षक	विनियोजित बजेट
१	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहकारी दर्ता क्षमता विकास तथा व्यवस्थापन	३९९९
२	बीउ पुँजी सहयोग	४९९९८
३	अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवासीय संरचना सुधार	२५९५४
४	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई बहु प्रतिभा कार्यक्रम सहयोग	२१०००
५	अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका उत्कृष्ट अभिभावक प्रोत्साहन	४८०००
६	एस इ इ परीक्षा उत्तीर्ण हुने अपाङ्गता भएका छात्र छात्रा प्रोत्साहन	१५९९९
७	दौतरी शिक्षा तालिम	१८०००
८	नव दम्पतिलाई शुभकामना कार्ड छपाइ र वितरण	९०००
९	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई मोबाइल फोन	४२०००
१०	वडा तथा पालिकास्तरीय समिक्षा	
११	विद्यालय भर्ना अभियान सहयोग	६०००
१२	सीपमूलक र व्यवसायीक तालिम	६००००
१५	शुभकाना कार्यक्रमको समिक्षा	१२०००
१६	वार्षिक योजना निर्माण कार्यशाला	१८०००











सामाजिक विकासतर्फ विनियोजित बजेटबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू			
क्र सं	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	कैफियत
१	अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस	४००००।-	सम्पन्न भइसकेको
२	ज्येष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम	१०००००।-	सञ्चालन हुन बाँकी रहेको
३	अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम बैठक भत्ता समेत	३०००००।-	सञ्चालन हुन बाँकी
नेपाल सरकार शसर्त अनुदान अन्तर्गत महिला बालबालिका तथा समाजकल्याणतर्फ प्राप्त कार्यक्रम			
१	महिला बालबालिका अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यको तथ्याङ्क सङ्कलन र अध्यावधिक	१०००००	कार्यान्वयनको क्रममा रहेको



???

धन्यवाद!


आ व २०७८/७९ मा सम्पन्न कार्यक्रमहरु

१ गाउँपालिका क्षेत्र भित्र रहेका
सहकारीहरुलाई सहकारी शिक्षा तालिम

1



2

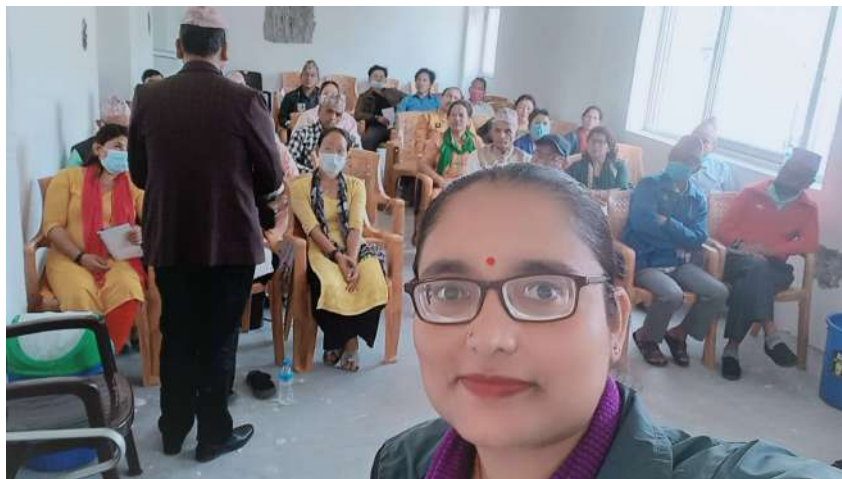

3

आ व २०७८/७९ मा चुलाचुली गाउँपालिकामा दर्ता भएका संस्थाहरू

संस्थाको नाम	ठेगाना	दर्ता मिति	दर्ता नं	अध्यक्षको नाम
१ सक्रिय युवा युनिट	चु चु ४	२०७८/०४/२८	११	चन्द्र बहादुर राई
२ फुङनाम खवाना खोला जल उपभोक्ता संस्था	चु च ६	२०७८/०९/०५	१२	टेक बहादुर विष्ट
३ सिन्धोलुङ फागो वनेम संघ	चु चु १	२०७८/११/०२	१३	सरण कुमार फागो
४ श्री शिवालय मन्दिर	चु चु ६	२०७८/११/०२	१४	टेक बहादुर विष्ट
५ अहाले मझौरी सोलवन र तोरीवारी जल उपभोक्ता संस्था	चु चु ६	२०७८/११/२६	१५	एटम राई

4

**आ व २०७८/७९ मा गा पा सूचिकृत भएका तथा संस्था
दर्ता नवीकरणका लागि सिफारिस दिइएका संस्थाहरु**

क्र सं	संस्थाको नाम	ठेगाना	दर्ता मिति	दर्ता नं	अध्यक्षको नाम
१	एकता समाज	चु चु ३	२०७६/१०/०२ जिल्ला प्रशासन कार्यालय	११८८	खड्ग सिंह विश्वकर्मा-अध्यक्ष क्षन्त्र कुमारी लावती-सचिव
२	चाँजुखोला नियन्त्रण जल उपभोक्ता समिति	चु चु २	२०७१/९/१६ जिल्ला प्रशासन कार्यालय	९३९	साने कुमाल- अध्यक्ष लोकनाथ दाहाल- सचिव
३	प्रभातकालीन सामाजिक तथा वातावरणीय विकास समूह	चु चु २	जिल्ला प्रशासन कार्यालय		
४	प्रवासी सन्जाल चुलाचुली	चु चु ३	२०७५/०७/६ जिल्ला	११५१	बलराम गिरी- अध्यक्ष

चुलाचुली गाउँपालिका क्षेत्र भित्र सन्चालित सहकारी संस्थाको नाम, ठेगाना	
श्री चुलाचुली ग्रामीण विधुत सहकारी संस्था लि	
चुलाचुली २ इलाम	
श्री तोरीवारी कृषि सहकारी संस्था लि.	
चुलाचुली ६ इलाम	
मावाखोला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था	
लि. चुलाचुली ६ इलाम	
विहानी कृषि सहकारी संस्था लि.	
चुलाचुली ६ इलाम	
फुडनाम कृषि सहकारी संस्था लि.	
चुलाचुली ६ इलाम	
मिक्लाचोड कृषि सहकारी संस्था लि.	
चुलाचुली ६ इलाम	
जनचेतना कृषि सहकारी संस्था लि. चुलाचु	
ली १ इलाम	
फूलबारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था	
लि. चुलाचुली २ इलाम	
महादेवस्थान कृषि सहकारी संस्था लि.	
चुलाचुली २ इलाम चुलाचुली कृषि सभा	

साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. चुलाचुली २ इलाम	
चुलाचुली कृषि सहकारी संस्था लि. चुलाचुली ३ इलाम	
श्री अन्नपूर्ण कृषि सहकारी संस्था लि. चुलाचुली २ इलाम	
दशमी कृषि सहकारी संस्था श्री चुरे कृषि सहकारी संस्था लि. चुलाचुली १ इलाम	
श्री आदर्श चुलाचुली बहुउद्देशीय सहकारी संस्था लि	
साना किसान कृषि सहकारी संस्था लि. चुलाचुली २ इलाम	
चुलाचुली कृषि सहकारी संस्था लि. चुलाचुली ३ इलाम	
श्री अन्नपूर्ण कृषि सहकारी संस्था लि. चुलाचुली	7

चुलाचुली गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिको कार्यालय
चुलाचुली, इलाम
अर्धवार्षिक समिक्षा कार्यक्रम
२०७८ फाल्गुण ३० गते सोमबार



आ.व. २०७८/०७९ मा प्रधानमन्त्री
रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित
योजनाहरूको वित्तिय तथा भौतिक
प्रगतिको अर्धवार्षिक
समिक्षा विवरण



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वडा गत योजनाहरू

वडा नं. १ अन्तर्गतका योजनाहरू

क्र.सं	शीर्षक	विनियोजित बजेट	कामको विवरण	कैफियत
१	सोमबारेको घर देखि सिरान तला हुँदै स्वप्न डाँडा पदमार्ग स्तरउन्नती	२५०,०००	८३५ मिटर पदमार्ग मर्मत र नयाँ निर्माण	सम्पन्न भएको
२	गोटि डाँडा हुँदै मैनाखुली पदमार्ग अपुरेलाई पुरा गर्ने काम	२९५,०००	९८८ मिटर पदमार्ग मर्मत र नयाँ निर्माण	सम्पन्न भएको
३	कामत लाइनमा खानेपानीको पाईप लाईन विस्तारको लागि नाली खन्ने र पुर्ने काम	१००,०००		
४	कमल खोला,बागद्वार खोलामा तट बन्धनको लागि बाँसको किला ठोक्ने काम	२९५,०००		
५	कान्छि बजारको झोलुङ्गे पुल हुँदै सिरान तलाजाने मार्ग नयाँ बाटो खन्ने काम	१००,०००		सम्पन्नता भएको
६	वडा कार्यालय भवनको आँगन सम्याउने पुर्ने काम	५०,०००		
जम्मा रकम		१,०९०,०००		

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वडा गत योजनाहरू

वडा नं. २ अन्तर्गतका योजनाहरू

क्र.सं	शीर्षक	विनियोजित बजेट	कामको विवरण	कैफियत
१	खानेपानी पाईपलाइन विस्तार	५९०,०००	४७०० मिटर खाने पानिको पाइप लाईन खन्ने पुर्ने काम	भुक्तानी बाकी
२	हिमाली मार्गको दायाँ बायाँ नाला निर्माण	३००,०००	२४०५ मिटर सडकको दायाँ बायाँ नाला सरसफाइ तथा निर्माण	सम्पन्न
३	चाँजु र वागद्वार खोलामा तटबन्धन	२००,०००		
जम्मा रकम		१,०९०,०००		

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षात्मक प्रस्तुती

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वडा गत योजनाहरू

वडा नं. ३ अन्तर्गतका योजनाहरू

क्र.सं	शीर्षक	विनियोजित बजेट	कामको विवरण	कैफियत
१	सुपारी बोटे पदमार्ग निर्माण	३००,०००		
२	सिमले पदमार्ग निर्माण	२००,०००		
३	रतुवा सिँचाई आयोजना वडा नं. ३ अन्तर्गतको खण्ड निर्माण	१००,०००		
४	शिवओरक मिलन पोखरी पर्यटकीय क्षेत्र पदमार्ग निर्माण तथा मर्मत	२९०,०००	१६३ मिटर पदमार्ग मर्मत र नयाँ निर्माण	भुक्तानी बाकी
५	किरातेस्वर मा.वि. खेल मैदान मर्मत	१००,०००		
६	विधुवा देखि माइसेबुङ सम्म जाने पदमार्ग निर्माण	१००,०००		
जम्मा रकम		१,०९०,०००		

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वडा गत योजनाहरू

वडा नं. ४ अन्तर्गतका योजनाहरू

क्र.सं	शीर्षक	विनियोजित बजेट	कैफियत
१	झण्डी डाँडा पर्यटक स्थल व्यवस्थापन तथा बाटो मर्मत	१००,०००	हाल सम्म कुनै पनि योजना सम्झौता नभएको ।
२	फायर लाइन बाटो मर्मत	२००,०००	
३	साँचे दोभान पदमार्ग	२००,०००	
४	विधुवा खोला नियन्त्रण तथा वृक्षारोपण	३९०,०००	
५	रतुवा नहरको शाखा कुलो	२००,०००	
जम्मा रकम		१,०९०,०००	

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षात्मक प्रस्तुती

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वडा गत योजनाहरू

वडा नं. ५ अन्तर्गतका योजनाहरू

क्र.सं	शीर्षक	विनियोजित बजेट	कामको विवरण	कैफियत
१	चुलाचुली रंगशालामा बाध लगाउने	२००,०००		
२	बुकुवा विधवा खोलामा तारजाली तथा बासको प्रयोग गरि जोखिम नियन्त्रण	२००,०००		
३	धिमालटारमा खानेपानीको पाईपलाईन खन्ने पुर्ने	१००,०००	७९५ मिटर खाने पानिको पाइप लाईन खन्ने पुर्ने काम	भुक्तानी बाकी
४	बुकुवा खोला पुच्छार कच्ची बाटो मर्मत तथा नाली निर्माण	१४०,०००		
	भानु मा.वि. को भौतिक सरसफाई तथा व्यवस्थापन	१००,०००		
	बाझोगाउँ मा.वि. को भौतिक सरसफाई तथा व्यवस्थापन	१००,०००		
	रमेश राईको देखि गोलग्राउण्ड हुदै चुधे खोला सम्म पुरानो बाटो रिङरोडको स्तरउन्नति र नाला निर्माण	२००,०००		
	गौरी गाउँबाट रङ्गशाला जाने पदमार्ग बाटो निर्माण	५०,०००		
जम्मा रकम		१,०९०,०००		

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वडा गत योजनाहरू

वडा नं. ६ अन्तर्गतका योजनाहरू

क्र.सं	शीर्षक	विनियोजित बजेट	कामको विवरण	कैफियत
१	कालापानी पदमार्ग	२००,०००		
२	दशमी देवीस्थान पर्खाल निर्माण	१००,०००		सम्झौता भएको
३	मावाखोला सडक ग्राभेल	३००,०००		सम्झौता भएको
४	नालुङ्ग दुङ्गा संरक्षण	१००,०००		सम्झौता भएको
५	फुङ्नाम ढल निकास	३९०,०००		
जम्मा रकम		१,०९०,०००		

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षात्मक प्रस्तुती

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको वित्तीय प्रगति

क्र.सं	शीर्षक	विनियोजित बजेट	खर्च प्रतिशत
१			
२			
३			
४			
५			


वडागत सञ्चालित योजनाहरूको भौतिक
प्रगतिका केही झलकहरू



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षात्मक प्रस्तुती





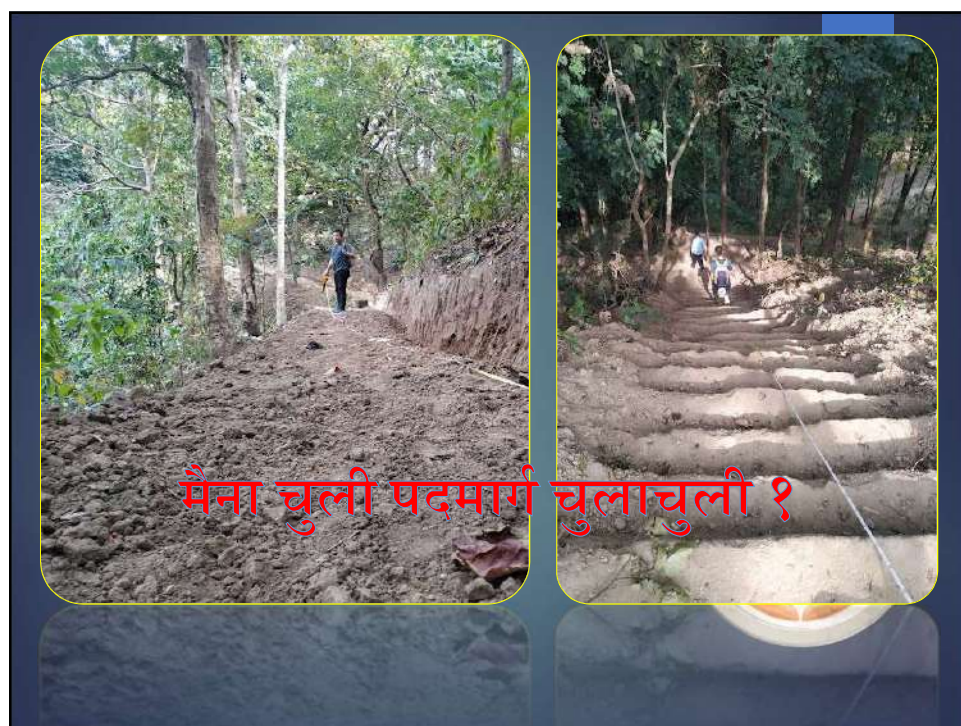

आ.व. २०७८।०७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सुचिकृत बेरोजगार व्याक्ती हरूको वडा गत विवरण

क्र. सं.	वडा नम्बर	सुचिकृत बेरोजगार व्याक्तिको संख्या			कुल रोजगारीमा संलग्न व्याक्तिको संख्या	कुल रोजगारीको दिनहरू	कैफियत
		महिला	पुरुष	जम्मा संख्या			
१	१	२४	४२	६६	९२	१६३५	कुल योजना -३५
२	२	३२	४६	७८			
३	३	३०	११५	१४५			
४	४	१४	४५	५९			
५	५	२२	६०	८२			
६	६	४५	७२	११७			
जम्मा		१६७	३८०	५४७	९२	१६३५	

दैनिक ज्याला दर ५७७



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षात्मक प्रस्तुती

धन्यवाद !!!



प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समिक्षात्मक प्रस्तुती

**आ.व. २०७८/०७९ मा सञ्चालित योजना तथा
कार्यक्रमहरूको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रम**

२०७८ । ११।३० गते

**आयोजक
चुलाचुली गाउँपालिकाको कार्यालय
चुलाचुली, ईलाम**

वडा नं. १				
क्र.सं.	शीर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत
१	दैनिक ज्यालादारीमा दोभाषे कर्मचारी तलब व्यवस्थापन	२,०२,०००	००	००
२	पदाधिकारी बैठक भत्ता	१४४०००	४००००	२८.५७
३	पानी विजुली	२०,०००	७८९८.७०	३९.५९
४	सञ्चार महशुल	२५,०००	००	००
५	इन्धन पदाधिकारी	३६,०००	१८०००.००	५०.००
६	इन्धन कार्यालय	३६,०००	१७६५०.००	५९.०३
७	सवारी साधन मर्मत	५०,०००	२७,०५०.००	५४.१०
८.	विमा तथा नवीकरण खर्च	२०,०००	००	००
९	मेशिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन खर्च	७०,०००.००	००	००

चालू खर्चतर्फ

वडा नं. १				
क्र.सं.	शीर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत
१०	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	१००,०००	००	००
११	पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन	२०,०००	१५०००.००	७५.००
१२	भ्रमण खर्च	५०,०००	००	००
१३	विविध खर्च	१२२,०००	१४२६०.००	११.६९
१४	अन्य सहायता	१,००,०००	१०,०००.००	१०
जम्मा		१०,००,०००	१,४९,८५८.७०	१४.९८

योजना तथा कार्यक्रमहरु

सं.		बजेट	अवस्था	प्रतिशत
वडा नं. १				
१	जनता मा.वि.शिक्षक व्यवस्थापन	२,९६,०००	१,४०,०००	४७.३०
२	महिला सिलाई कटिड प्रशिक्षक र सामग्री खरिद	१००,०००	००	००
३	चासोक तडनाम कार्यक्रम, साकेला नृत्य प्रदर्शन, ल्होसार पर्व, हरितालिका तिज प्रवर्द्धन कार्यक्रम	९०,०००	००	००
४	बाल क्लवहरुलाई वीडिओ पूँजी अनुदान कार्यक्रम	६५,०००	००	००
५	फूटवल,भलिवल खेलकूद सामग्री खरिद	५०,०००	००	००
६	स्वास्थ्य चौकि प्राङ्गण पुर्नेकाम	२५,०००	००	००
७	स्वावलम्बन समुहका लागि सचेतनामुलक कार्यक्रम	२५,०००	००	००
८	भवना पोल्ट्री फर्म खोर मर्मत अन'दान	५०,०००	००	००

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
वडा नं. १				
९	अध्यक्ष मार्ग कल्भर्ट निर्माण गर्ने	२,००,०००	००	००
१०	इमानसिह मार्ग ग्रावेल गर्ने	१,००,०००	००	००
११	इमोटल स्कूल उत्तर चुलाचुली मार्ग जोड्ने सडक ग्रावेल	५०,०००	५०,०००	१००
१२	एकता मार्ग अपूरो ग्रावेल	१,५०,०००	००	००
१३	कुमाले खोला इनार मर्मत गर्ने	५०,०००	००	००
१४	कृषि मार्ग जिरे होलि कल्भर्ट निर्माण	३,००,०००	००	००
१५	कृषि मार्ग अञ्चल खोल्सी ह्युमपाइप कल्भर्ट निर्माण	१,००,०००	००	००
१६	बंगुरको वीडिओ पाठा वितरण	२५,०००/-	००	००

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
वडा नं. १				
१७	कामत टोल उत्तर अपूरो ग्रावेल	५०,०००	००	००
१८	कारबारी टोल दक्षिण फाल्गुनन्द मार्ग जोड्ने संगम मार्ग ग्रावेल	२,००,०००	००	००
१९	किराँत हाडसाम माडहिमको अपूरो घेराबारा	२,००,०००	००	००
२०	चुलाचुली मार्ग उत्तर शिसोवन टोलसम्म ग्रावेल गर्ने	५०,०००	५०,०००	१००
२१	चौविसे होलि कल्भर्ट निर्माण	४,००,०००	४,००,०००	००
२२	जाल्पादेवि मार्ग दक्षिण मुकुलुङ मार्ग अपूरो मार्ग ग्राभेल	२,००,०००	२,००,०००	१००

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
वडा नं. १				
२३	जिरे होलि पूर्व चाम्लिङ मार्ग ग्राभेल	१,००,०००	रकमान्तर भएको	
२४	तित्तिरीबोटे खोल्माटाङ खानेपानी रिजर्भ ट्याङकी निर्माण	१,५०,०००	००	००
२५	तिमोम्मा ठाडो मार्ग चुम्लुङ चोक सम्म ग्रावेल	१,००,०००	००	००
२६	देउराली मार्ग उत्तर मिडकोक्मा डाँडा सम्म ग्रावेल	१,००,०००	१,००,०००	१००
२७	देउराली मार्ग ग्रावेल गर्ने	१,५०,०००	१,५०,०००	१००
२८	देउराली मार्ग पूर्व दाहाल खोल्सी हुँदै चौविसे टोल जोड्ने अपूरो सडकमा माटो पूर्ण तथा ग्रावेल गर्ने	१,००,०००	१,००,०००	१००

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
वडा नं. १				
२९	धराने कल्भर्ट कार्की बस्ती हुँदै बसन्त टोल सम्म सडक स्तरउन्नती र ग्राभेल	२,००,०००	००	००
३०	नमूना चोक पूर्व निमार्णाधिन भोलुङ्गे पुल हुँदै देउराली मार्ग ग्राभेल	५०,०००	००	००
३१	पिल्सिडेको घर उत्तर धराने मार्ग ग्राभेल	२,००,०००	२,००,०००	१००
३२	फाल्गुनन्द मार्ग पश्चिम,माडहिम मार्ग पूर्व यलम्बर मार्ग ग्राभेल	१,००,०००	१,००,०००	१००
३३	बेघा मार्ग ग्राभेल	५०,०००	००	००
३४	बरगाछी गुम्बा निर्माण	१,००,०००	००	००

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
३५	बरगाछी देवीथान अपूरो घेराबारा निर्माण	१,००,०००	००	००
३६	बागद्वार पारी अपूरो कृषि मार्ग ग्राभेल गर्ने	५०,०००	५०,०००	१००
३७	माडहिम मार्ग लावती चोक दक्षिण बागद्वार खोलामा निमार्णाधिन पुलसम्म सडक ग्राभेल	१५०,०००	१,५०,०००	१००
३८	याङनामे मार्गबाट बाल्मीकी मार्ग जोड्ने सडक ग्राभेल	१,००,०००	००	००
३९	वनेम कल्याण संस्थाको घेराबारा गर्ने	१,००,०००	००	००
४०	वनेम मार्गमा डिजिटल बोर्ड राख्ने	६९०००	००	००

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
४१	श्री जंगा मार्ग मर्मत गर्ने	१,००,०००	००	००
४२	शहिद धिरेन मार्ग मर्मत गर्ने	३,००,०००	००	००
४३	शहिद मान्तोक मार्ग पश्चिम सिँचाइ मार्ग ग्राभेल गर्ने	२,००,०००	००	००
४४	शहिद मान्तोक शालिकको अपूरो निर्माण कार्य पूरा गर्ने	८०,०००	००	००
४५	स्वप्नशिल डाँडा पर्यटकिय क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने	१,००,०००	००	००
४६	सानो खोल्सी ट्रस ब्रिज निर्माण	१,००,००	००	००
४७	सिरानतला मार्गमा रेलिङ निर्माण	१,००,०००	००	००
४८	हाडसाम माडहिमपूर्व फाल्गुनन्द मार्गसम्म ग्राभेल	२,००,०००	२,००,०००	१००
	कुल जम्मा	५५,२५,०००	१४,५०,०००	२६.२४

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण वडा नं. १				
क्र.सं.	व्यक्तिगत घटना	महिला	पुरुष	जम्मा
१	जन्म दर्ता	४८	४७	९५
२	मृत्यु दर्ता	१८	१६	३४
३	सम्बन्ध बिच्छेद			२
४	विवाह दर्ता			४५
५	बसाई सरी आएको परिवार संख्या			२६
६	बसाई सरी जाने परिवार संख्या			१३
वडाबाट भएका सिफारिसहरु				
१	गा.पा. मा पठाएको सिफारिस			१०७
२	अन्यत्र पठाएको सिफारिस			९५८
	जम्मा सिफारिस संख्या			१०६५

मिति २०७८/०४/०१ देखि मिति २०७८/११/२९ सम्मको आम्दानि		
क्र.स.	आय शिर्षक	संकलित रकम
१	भूमिकर/ मालपोत	४,००,४९०/-
२	घर बहाल कर	४९२०/-
३	व्यावसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	२८,०००/-
४	सिफारिस दस्तुर	३,८१,७५०/-
५	व्यक्तिगत घटना दस्तुर	५,४००/-
६	नाता प्रमाणित दस्तुर	९,६५०/-
७	अन्य राजश्व	३१,६००/-
	जम्मा	८,६१,८१०/-

शिर्षक अनुसार योजनाको प्रगति विवरण					
	योजनाको संख्या	उपभोक्ता समिति गठन भएको योजना संख्या	सम्झौता सम्पन्न भइ काम चालु रहेका योजना संख्या	भुक्तानि सम्पन्न भएका योजना संख्या	कैफियत
आर्थिक विकास	२	००	००	००	
सामाजिक विकास	८	००	००	१	स्वास्थ्य समूहका लागि सचेतना कार्यक्रम र बालकलबको लागि विउ पुँजी अनुदान भुक्तानि मागको प्रक्यामा रहेको र जनता मा.वि शिक्षक व्यवस्थापनबाट निजिस्रोत शिक्षकलाई साउन देखि पौष सम्मको तलव भुक्तानि दिइएको ।
पूर्वाधार विकास	३८	३८	११	१७	
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम	५	३	३	२	

धन्यवाद ।

आ.व. २०७८।०७९ मा सञ्चालित
योजना तथा कार्यक्रमहरुको
अर्धवार्षिक समीक्षा

मिति- २०७८/११/३०



चुलाचुली २ नं. वडा कार्यालय बाह्रगोठे- इलाम ।

● विषय सुचीहरु -

१. वडागत चालु खर्च सम्बन्धी जानकारी,
२. सुशासन, सामाजिक तथा आर्थिक विकासको जानकारी,
३. पुर्जीगत खर्च सम्बन्धी जानकारी,
४. प्रशासनिक कार्यको सामान्य जानकारी,

१ चालू खर्चतर्फ

वडा नं. २				
क्र.सं.	शीर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत
१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	१२०,०००	२९,०००	२४.१७
२	पानी विजुली	५०,०००	१०,५६५	२१.१३
३	सञ्चालन महशुल	३०,०००	५,०००	१६.६४
४	इन्धन कार्यालय	५०,०००	२२,१७४	४४.३५
६	सवारी साधन मर्मत	७०,०००	३३,७००	४८.१४
८.	मेशिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन खर्च	६०,०००	३०,६४९	५१.०४

चालू खर्चतर्फ				
वडा नं. २				
क्र.सं.	शीर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत
९	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	१,१०,०००	०	०
१०	पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रशासन	१०,०००	०	०
११	भ्रमण खर्च	१,००,०००	९,७००	९.७
१२	विविध खर्च	२००,०००	७१,११०	३५.५६
१३	अन्य सहायता	१,००,०००	२५,०००	२५
कूल रकम		१०,००,०००	२३६,८१०	२३.६९

वडा नं. २
 सुशासन, सामाजिक तथा
 आर्थिक विकास तर्फ

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	प्रगती
वडा नं. २				
१.	ड्राईभिङ्ग तालिम	१००,०००/-	सञ्चालन भईरहेको	
२.	यलम्वर शालिक शिलालेख व्यवस्थापन	२५०००/-	सञ्चालन भईरहेको	
३.	महिला सिलाई कटाई तालिम	१०००००/-	सञ्चालन भईरहेको	
४.	आदीवासि जनजाती राई, लिम्बु, नेवार, तामाङ्ग, कुमाल मगर चाईपर्व विशेष कार्यक्रम	६००००/-	सञ्चालन भईरहेको	
५.	पञ्चकन्या आ. वि शिक्षक व्यावस्थापन	८१६०००/-	सञ्चालन भईरहेको	
६.	जनता मा. वि. शिक्षक व्यवस्थापन	१८०,०००/-	सञ्चालन भईरहेको	

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
वडा नं. २				
७.	टोल विकास संस्था व्यावस्थापन	७५०००/-	सञ्चालन भईरहेको	
८.	फोहोरमैला व्यावस्थापन	५००००/-	सञ्चालन भईरहेको	
९.	खेलकुद सामग्री वितरण	५००००/-	शुन्य प्रतिशत	
१०.	पशुपंक्षी उपचार तालिम	३००००/-	शुन्य प्रतिशत	

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
वडा नं. २				
११.	चुलाचुली स्वास्थ्य चौकी ओषधी व्यवस्थापन	१००,०००/-	शुन्य प्रतिशत	
१२.	वातावरण तथा जलवायु संरक्षण कार्यक्रम	१००००/-	शुन्य प्रतिशत	
१३.	ल्यापटप प्रिन्टर खरिद	१००००/-	शुन्य प्रतिशत	

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
आ. व २०७८/०७९ बजेट उपशिर्षक - चुलाचुली गाउँपालिका वडा नं. २ बजेट प्रकार - पुर्जिगत				

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
१४.	अर्नाखाडी नर्सरी केखा खण्ड ग्रावेल	२०००००/-	योजना सञ्चालन भईरहेको	
१५.	जनता मा. वि. स्वामी चोक खण्ड उच्चस्तरीय ग्रावेल	४०००००/-	योजना सञ्चालन भईरहेको	
१६.	थोक्लीहाङ्ग पुर्व पश्चिम बाटो ग्राभेल	२०००००/-	योजना सञ्चालन भईरहेको	
१७.	जनता मावि बोहोरा कल्भर्ट खण्ड उच्चस्तरीय ग्राभेल	६०००००/-	योजना सञ्चालन भईरहेको	
१८.	जनता मावि स्वामी चोक खण्ड उच्च स्तरीय ग्राभेल	२०००००/-	योजना सञ्चालन भईरहेको	
१९.	बुढिझोला खड्कुडे खण्ड उच्च स्तरीय ग्राभेल	६०००००/-	योजना सञ्चालन भईरहेको	

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
२०.	जनता मावि फायर लाईन खण्ड उच्चस्तरीय ग्राभेल	४०००००/-	योजना सञ्चालन भईरहेको	
२१.	स्वास्थ्य चौकी पुर्व पश्चिम बाटो ग्राभेल	१०००००/-	योजना सञ्चालन भईरहेको	
२२.	ह्युमपाईप खरिद	२०००००/-	समझौता नभएको *	
२३.	दाहसंस्कार तथा समाधि स्थल निर्माण	१०३०००/-	समझौता नभएको *	
२४.	ज्येष्ठ नागरिक भ्रमण	१२००००/-	कार्य सम्पन्न	
२५.	फरक क्षमता भएका व्यक्तिको कार्यक्रम	२००००/-	कार्य सम्पन्न	
२६.	तीज विशेष कार्यक्रम	३००००/-	कार्य सम्पन्न	

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
२७.	सामुदायिक विद्यालयका विपन्न दलित बालबालिकालाई साईकल वितरण	१३००००/-	कार्य सम्पन्न	
२८.	वडा भरिका किर्तन समुहलाई वाद्यवादन सामग्री वितरण	१२००००/-	कार्य सम्पन्न	
२९.	मकैको विउ वितरण	१०००००/-	कार्य सम्पन्न	
३०.	आलुको विउ वितरण	१०००००/-	कार्य सम्पन्न	

क्र.स.	व्यक्तिगत घटना			
१	जन्म दर्ता			७१
२	मृत्यु दर्ता			२०
३	सम्बन्ध विच्छेद			४
४	विवाह दर्ता			३७
५	बसाई सरी आएको परिवार संख्या			१२
६	बसाई सरी जाने परिवार संख्या			१८
वडाबाट भएका सिफारिस				
७	गा.पा. मा पठाएको सिफारिस			४१
८	जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाम			६३
९	मालपोतमा गरिएको सिफारिस			६७
१०	अन्यत्र पठाएको सिफारिस			६५१







धन्यवाद् ,

जय बाल मैत्री ॥

**आ.व. २०७८/०७९ मा सञ्चालित योजना तथा
कार्यक्रमहरूको अर्ध वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम**

**२०७८ फाल्गुन ३० गते
सोमबार**

**आयोजक
चुलाचुली गाउँपालिकाको कार्यालय
चुलाचुली, ईलाम**

चालू खर्चतर्फ

वडा नं. ३				
क्र.सं.	शीर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत
१.	<u>चालू खर्चतर्फ</u>	१०,००,०००	३,४३,६६८	३४.४६%

वडा नं. ३

पुजीगत तर्फ

क्र. सं.	शीर्षक	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
वडा नं. ३				
१.	कुल विनियोजन	६२,००,०००।-	८८५०००।-	१४.२७%
सञ्चालन सम्पन्न भएका योजनाहरु तपशील बमोजिम छन्-				
१.	देउराली चौकदेखि मंगल शिद्धि सम्मको उच्च स्तरिय ग्राबेल	४,००,०००।-	४,००,०००।-	१००%
२.	मंगल सिद्धिदेखि जिते कान्छीको घरसम्म ग्राबेल	१,७५,०००।-	१,७५,०००।-	१००%
३.	सवारी साधन खरिद वडा नं. ३	२,५०,०००।-	२,५०,०००।-	१००%
४.	सुर्योदय वि शिक्षक व्यवस्था	२३९०००।-	६००००।-	२५.९७%

राजश्व आम्दानी विवरण

वडा नं. ३

क्र.स.	व्यक्तिगत घटना	जम्मा
१	नगदी रसदिबाट आम्दानी	१,९४,१५०।-
२	मालपोत आम्दानी	१,१७,१३०।-
३	कुल आम्दानी	३,११,२८०।-

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

वडा नं. ३

क्र.स.	व्यक्तिगत घटना	महिला	पुरुष	जम्मा
१	जन्म दर्ता	११३	१११	२२४
२	मृत्यु दर्ता	१७	१२	२९
३	सम्बन्ध बिच्छेद			४
४	विवाह दर्ता			४६
५	बसाई सरी आएको परिवार संख्या			२४
६	बसाई सरी जाने परिवार संख्या			१७
वडाबाट भएका सिफारिस				
१	गा.पा. मा पठाएको सिफारिस			१७१
२	अन्यत्र पठाएको सिफारिस			४६३

आ.व.२०७८/७९ को पहिलो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण

अनुसूची ४
दफा ७ सँग सम्बन्धित

अनुमानित बजेट प्रतिवेदन

जिल्ला : ईलाम गा.पा.न.पा. : चुलाचुली वडा : ३ आर्थिक वर्ष : २०७८/७९ अवधिको किसिम : त्रैमासिक किस्ता : प्रथम

वडा नं.	जेष्ठ नागरिक भत्ता (७० वर्षमाथि)		जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)		जेष्ठ नागरिक एकल महिला		विधवा (आर्थिक सहायता)		क वर्ग		ख वर्ग (आर्थिक सहायता)		दलित बालबालिका		जम्मा	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम
३	१९२	२२९२०००	१०	७४४८०	४५	३५९१००	३५	२७१३२०	६	७१८२०	४०	२५५३६०	१०	१४३८२	३३८	३३३८४६२
जम्मा	१९२	२२९२०००	१०	७४४८०	४५	३५९१००	३५	२७१३२०	६	७१८२०	४०	२५५३६०	१०	१४३८२	३३८	३३३८४६२

आ.व.२०७८/७९ को पहिलो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण विवरण

जिल्ला : ईलाम गा.पा.न.पा. : चुलाचुली वडा : ३ आर्थिक वर्ष : २०७८/७९ अवधिको किसिम : त्रैमासिक किस्ता : द्वितीय

वडा नं.	जेष्ठ नागरिक भत्ता (७० वर्षमाथि)		जेष्ठ नागरिक भत्ता (दलित)		जेष्ठ नागरिक एकल महिला		विधवा (आर्थिक सहायता)		क वर्ग		ख वर्ग (आर्थिक सहायता)		दलित बालबालिका		जम्मा	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम
३	१९२	२२७७३२०	११	८७४८०	४५	३५३७८०	३६	२८१६२०	६	७१८२०	४०	२५५३६०	११	१५७४७	३४१	३३४६४२७
जम्मा	१९२	२२७७३२०	११	८७४८०	४५	३५३७८०	३६	२८१६२०	६	७१८२०	४०	२५५३६०	११	१५७४७	३४१	३३४६४२७

वडामा सञ्चालित कार्यक्रम का फोटोहरु



नयाँ भवनबाट यसै आ.व.को सुरुवात
देखी सेवा प्रवाह सुचारु भएके



राष्ट्रिय परिचय पत्र विवरण दर्ता
कार्यक्रमको झलक मिति २०७८/०६/
देखि मिति २०७८/०६/ सम्म



बालबालिका सम्बन्धी अन्तरक्रिया
कार्यक्रम वडा नं. ३ मिति २०७८/०७/२६
मा



कृषि शाखाबाट प्राप्त वडा नं. ३ का
कृषकहरुलाई वितरण भएको आलुको
बिउ



टोल स्तरीय बालबालिका लक्षित
कार्यक्रम



श्री किरातेश्वर मावि का विद्यार्थिद्वारा
सञ्चालित बालबालिका सम्बन्धी
सचेतनामुक्त प्रभातफेरीको झलक



राष्ट्रिय मानव अधिकार मञ्चद्वारा
वितरण गरिएको बंगुरका पाठा वडा नं.
३ का कृषकहरुलाई



अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पोषण सामाग्री र शैक्षिक सामाग्री वितरणको झलक



बालमैत्री पद्धति र व्यवहारः समृद्ध चुलाचुलीको भन्ने नारालाई सार्थक बनाउने अभियान अन्तर्गत आज वडा नं ३ का ७ वटै टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरूसँग बालमैत्री अन्तर्कृया कार्यक्रम



चुलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ३ को स्वास्थ्य केन्द्रमा
टेलिमेडिसिन सेवा मार्फत परिवार नियोजन तथा सुरक्षित
गर्भपतन सेवा प्रदान गर्दै स्वास्थ्यकर्मी कर्मचारीहरू ।



श्री किरातेश्वर मा.वि.को बालमैत्री
स्थानीय वडा समितिबाट गरिएको
अनुगमनका झलकहरू









धन्यवाद !!!

आ.व. २०७८/०७९ मा सञ्चालित योजना
तथा कार्यक्रमहरुको अर्धवार्षिक समीक्षा
कार्यक्रम

२०७८ फागुन ३० गते सोमबार

आयोजक

चुलाचुली गाउँपालिकाको कार्यालय

चुलाचुली, ईलाम

बालमैत्री पद्धति र व्यवहार,
समृद्ध चुलाचुलीको आधार ।।

जय बालमैत्री ।।
नमस्कार ।।।

वडा नं. ४ को प्रस्तुतीकरण

चालू खर्चतर्फ

वडा नं. ४				
क्र.सं.	शीर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत
१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	१,४४,०००	७२,०००	५०
२	पानी तथा विजुली	५०,०००	२६,५७२	५३.१४
३	सञ्चार महशुल इन्टरनेट तथा सुचना प्रकाशन	५०,०००	२४,०००	४८
४	इन्धन वडा नं ४	९६,०००	४४७७४	४६.६४
५	सवारी साधन मर्मत	७०,०००	०	०
६	विमा तथा नवीकरण खर्च	२०,०००	०	०
७	मेशिनरी औजार मर्मत तथा सञ्चालन खर्च	४०,०००	३५००	८.७५

चालू खर्चतर्फ**वडा नं. ४**

क्र.सं.	शीर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत
८	मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री	१,४०,०००	६०,०१३	४२.८७
९	भ्रमण खर्च	१,१०,०००	०	०
१०	विविध खर्च	२,२०,०००	९०,६२०	४१.१९
११	अन्य सामाजिक सहायता	६०,०००	९,०००	१५
जम्मा		१०,००,०००	३,३०,४७९	३३.०४

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	बिनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	कैफियत
वडा नं. ४				
१	किराँत चोलुङ मा.वि. को शिक्षक व्यवस्थापन निरन्तरता	१,१४,०००	१०५०००	
२	अपाङ्ग लक्षित कार्यक्रम	३०,०००	०	
३	महिला लक्षित कार्यक्रम	३०,०००	०	
४	वडा नं ४ का चर्चहरुलाई सहयोग	५०,०००	०	
५	जनजाती लक्षित कार्यक्रम	५०,०००	०	
६	जेष्ठ नागरिक लक्षित कार्यक्रम	१,००,०००	०	

	कृषि लक्षित कार्यक्रम	२,००,०००	रकमान्तर	
७	आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रलाई विविध मसलन्द	४०,०००	०	खरीद प्रक्रियामा रहेको
८	स्वास्थ्य केन्द्र व्यवस्थापन तथा सचेतनामुलक कार्यक्रम	५०,०००	०	
९	पुष्पाञ्जली किर्तन मण्डलीलाई सहयोग	३०,०००		
१०	गाउँपालिका साभेदारीमा सिटेहोली अपुरो कलभर्ट निर्माण	१०००००	०	टेक्का प्रक्रियामा
११	पालिका देखि थापाचोक जाने बाटो स्तरोन्नती	२,००,०००	सम्पन्न	

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	कैफियत
बडा नं. ४				
१२	बालबालिका लक्षित कार्यक्रम	५०,०००	०	
१३	दलित लक्षित कार्यक्रम	४०,०००	०	
१४	खेलकुद लक्षित कार्यक्रम	५०,०००	८,०००	
१५	बालज्योति मा.वि. शिक्षक व्यवस्थापन निरन्तरता	२,४४,०००	१,०५,०००	रकमान्तर ३९,०००
१६	किराँत हाडसाम मन्दिर सहयोग	५०,०००	५०,०००	
१७	शिव मन्दिरलाई सहयोग	५०,०००	०	
१८	साकेला थान मन्दिरलाई सहयोग	५०,०००	०	
१९	पुर्णिमा किर्तन मण्डलीलाई सहयोग	३०,०००	०	

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	कैफियत
वडा नं. ४				
२०	आइतबारे बजार व्यवस्थापन	१,००,०००	सम्पन्न	पानीको उपलब्धता, ट्राफिक कन्ट्रोल
२१	चुलाचुली रंगमञ्चलाइ नाटक मञ्चन तथा व्यवस्थापन गर्ने	३०,०००	सम्पन्न	
२२	वृत्तचित्र निर्माण	५०,०००	रकमान्तर	शिवाली मार्गमा
२३	कृषि सडक पुच्छारको भ्रपा इलाम सिमानामा गेट निर्माण	२,२२,०००	निर्माणाधिन	अन्तिम चरणमा रहेको
२४	किराँत चोकदेखि पश्चिम बाटो	१,००,०००	०	सम्झौता भएको
२५	किराँत भवन अगाडीको बाटो	५०,००००	सम्पन्न	स्तरोन्नती भएको ।

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	कैफियत
वडा नं. ४				
२६	गाउँपालिकाको साभेदारीमा लाम्बुसाङको घरदेखि किराँतचोलुङ जाने बाटो	१,५०,०००	०	
२७	गाउँपालिकाको साभेदारीमा सिर्जना मार्ग स्तरोन्नती	१,३०,०००	०	
२८	गाउँबेशी मार्गको होली मर्मत	२,००,०००	सम्पन्न	
२९	त्रिवेणी र देवीथान कल्भर्ट निर्माण	३,००,०००	०	सम्झौता बाँकी
३०	तिनफन्के होली कल्भर्ट निरन्तरता	४,५०,०००	सम्पन्न	
३१	तिरतिरे खोला तटबन्धन	१,५०,०००	सम्पन्न	
३२	प्रयासचोक आसपास बाटो मर्मत	२,००,०००	०	भुक्तानीको चरणमा रहेको

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	कैफियत
वडा नं. ४				
३३	मर्मत सम्भार कोष	३,००,०००	३६,०००	
३४	वडा कार्यालय व्यवस्थापन खर्च	२,००,०००	८०,३४८	फर्निचर खरीद
३५	शिवाली मार्ग स्तरोन्नती	२,५०,०००	०	प्रदेश सरकार
३६	सुम्निमा चोकदेखि पश्चिम ग्राभेल	१,००,०००	सम्पन्न	
३७	साधुहोली छेउको होलीमा ह्युम पाइप जडान	३,००,०००	०	निर्माणाधीन रहेको
३८	सालबारी मार्ग ग्रावेल	६०,०००	सम्पन्न	
३९	ह्युम पाइप खरीद तथा जडान	३,००,०००	रकमान्तर	तिनफन्के होली कल्भर्ट
४०	श्रीजंगा मार्ग तथा साँचे दोभान विद्युत विस्तार	३,००,०००	०	भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको
		४२,४२,०००		

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण				
वडा नं. ४				
क्र.स.	व्यक्तिगत घटना	महिला	पुरुष	जम्मा
१	जन्म दर्ता	३६	२७	६३
२	मृत्यु दर्ता	१४	९	२३
३	सम्बन्ध बिच्छेद			१
४	विवाह दर्ता			४०
५	बसाई सरी आएको परिवार संख्या			२२
६	बसाई सरी जाने परिवार संख्या			३
१	वडामा दर्ता भएका निवेदन हरू			८५४
१	गा.पा. मा पठाएको सिफारिस			१२५
२	अन्यत्र पठाएको सिफारिस			८०४

चालु आ .व. को मिति २०७८/११/२९
सम्मको राजश्व विवरण

● जम्मा राजश्व ४,३९,१३३।-

● ४ नं वडामा सञ्चालन
भएका योजना तथा
कार्यक्रमहरुको केहि
तस्विरहरु

प्रयासचोक आसपास बाटो मर्मतको
सार्वजनिक सुनुवाईको क्रममा लिइएको फोटो



किराँत भवन अगाडीको बाटो ग्रावेल सम्पन्न



कृषि सडक पुच्छारको निर्माणाधिन गेट ।



साधु होली छेउमा ह्युम पाइप जडानको
क्रममा ।



तिनफन्के होली कल्भर्ट निरन्तरताको कार्य
सम्पन्न ।



किराँत हाडसाम मन्दिरलाई सहयोग कार्यक्रम



गाउँवेशी मार्गको होली मर्मत ।



- चुलाचुली गाउँपालिका वडा नं ४ मा बालमैत्री अभियान सँग सम्बन्धित कार्यक्रम तथा अनुगमनका विभिन्न तस्वीरहरु

किराँत चोलुङ आ.वि मा बालमैत्री सम्बन्धी जनचेतना ।



बालमैत्री सम्बन्धी जनचेतना ।



बालमैत्री सम्बन्धी जनचेतना ।



बालमैत्री सम्बन्धी जनचेतना ।



बालमैत्री धारा ।



बालमैत्री अनुगमन टोली ।



विद्यालय अनुगमन ।



विद्यालय अनुगमन ।



श्री बालज्योती मा.विमा बालमैत्री धारा ।



शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था ।



किराँत भवनमा बालमैत्री कार्यक्रम ।



किराँत भवनमा बालमैत्री कार्यक्रम ।



हिन्जा निसान बालबिकाश केन्द्रमा बालमैत्री कार्यक्रम ।



- हेरचाहका लागि उत्प्रेरणा कार्यक्रम
अन्तर्गतका तस्वीरहरु

सुनौलो हजार दिनका आमाहरुलाई पोषण
शिक्षा कार्यक्रमका भलक हरु ।



सुनौलो हजार दिनका आमाहरुलाई पोषण
शिक्षा कार्यक्रमका भलक हरु ।



अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पोषण
सहयोग तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरिँदै ।



अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि पोषण
सहयोग तथा शैक्षिक सामग्री वितरण गरिँदै ।



पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई
ह्वीलचेयर प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न ।



● केहि जिज्ञाशा ???

भुलवश केहि त्रुटी भए
माफी चाहन्छु ।

धन्यवाद ।

● जय बालमैत्री ।।।



चालू खर्चतर्फ						
वडा नं. ५						
क्र. सं.	शीर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च भएको रकम रु.	खर्च प्रतिशत	मौज्दात प्रतिशत	कैफियत
१	पदाधिकारी बैठक भत्ता	१४४,०००।-	४८,०००।-	३३.३३%	६६.६७%	
२	पानी तथा विजुली संचार महशुल तथा	४६,०००।-	१६,१७०।-	३५.१५%	६४.८५%	
३	इन्टरनेट	४४,०००।-	६,५००।-	१४.७७%	८५.२३%	
४	इन्धन पदाधिकारी	४८,०००।-	१६,०००।-	३३.३३%	६६.६७%	
५	इन्धन कार्यालय	४८,०००।-	२६,२०७.५०।-	५४.६०%	४५.४०%	
६	सवारी साधन मर्मत खर्च	८०,०००।-	२७,४५०।-	३४.३१%	६५.६९%	
७	बिमा तथा नविकरण मेशिनरी एवं औजार मर्मत सम्भार तथा	२०,०००।-	१२,७४०।-	६३.७०%	३७.३०%	
८	सञ्चालन खर्च	८०,०००।-	१८,५००।-	२३.१३%	७६.८७%	

वडा नं. ५						कैफियत
क्र. सं.	शीर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत	मौज्दात प्रतिशत	
९	मसलन्ध तथा कार्यालय सामग्री	१,००,०००।-	०।-	०%	१००%	
१०	पत्रपत्रिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन	५०,०००।-	२२,५००।-	४५.००%	५५.००%	
११	कार्यालय व्यवस्थापन(आपत विपत अन्य)	८०,०००।-	४१,८८८।-	५२.३६%	४७.६४%	
१२	भ्रमण खर्च	८०,०००।-	११,२००।-	१४.००%	८६.००%	
१३	विविध खर्च	१,४०,०००।-	४०,२००।-	२८.७१%	७७.२९%	
१४	आर्थिक विपन्नतालाई अन्य सहायता	१,००,०००।-	२२,०००।-	२२.००%	७८.००%	
१५	पिन्टर खरिद १ थान	४०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	

वडा नं. ५						कैफियत
क्र. सं.	शीर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत	मौज्दात प्रतिशत	
जम्मा		११,००,०००।-	३,०९,३५५.५१	३०.९३%	६९.०७%	



क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत	मौज्दात प्रतिशत	कैफियत
आर्थिक विकास तर्फका योजनाहरु						
१	इस्क्याभेटर संचालन	१,००,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
२	व्यवसायिक कृषि उत्प्रेरणा कार्यक्रम तथा विउविजन वितरण	१,५०,०००।-	१,५०,०००।-	१००.००%	०.००%	
३	व्यवसायिक पशुपालकलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम	२,००,०००।-	०	०.००%	१००.००%	
४	विपद व्यवस्थापन	२,००,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत	मौज्दात प्रतिशत	कैफियत
आर्थिक विकास तर्फका योजनाहरु						
५	कृषीमार्ग वाटो ग्रावेल	५०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
६	वडा कार्यालयदेखि उत्तर तेर्सो वाटो सम्म ग्रावेल	५०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
	जम्मा	७,५०,०००।-	१,५०,०००।-	२०.००%	८०.००%	

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत	मौज्दात प्रतिशत	कैफियत
सामाजिक विकास तर्फका योजनाहरु						
१	मठ मन्दिर, चर्च, गम्बा आदिमा फोहोर व्यवस्थापनको लागी डष्ट विन खरिद गरि हस्तान्तरण कार्यक्रम	८०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	सवै रकम रकमान्तर गरिएको
२	वालमैत्री सगैं सम्बन्धितका कार्यक्रम	८०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
३	आर्थिक विपन्नता , अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई स्वास्थ्य विमामा पहुँच र सोका वालवालिकाहरुलाई लत्ता कपडा खरिद गरि वितरण कार्यक्रम	१,२०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
४	चुलाचुली वडा नं. ५ को भौगोलिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सार्वजनिक क्षेत्र सहितको नक्सा निर्माण	८०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
५	जेष्ठ नागरिक तिर्थयात्रा कार्यक्रम	२,००,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	सवै रकम रकमान्तर गरिएको

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत	मौज्दात प्रतिशत	कैफियत
सामाजिक विकास तर्फका योजनाहरु						
६	बाझोगाँउ मा.वि. शिक्षक व्यवस्थापन	२,५०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
७	युवा लक्षित कार्यक्रम	१,००,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
८	विधालयमा आधारित रहि वालवालिका लक्षित कार्यक्रम	७०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
९	भानु मा.वि. रंगरोकन, मर्मत तथा व्यवस्थापन खर्च	४,००,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
१०	स्वास्थ्य सँस्थाको लागी अत्यावश्यक सामग्री खरिद तथा निर्माण	१,००,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	५०,०००।- रकमान्तर गरिएको
जम्मा		१४,८०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत	मौज्दात प्रतिशत	कैफियत
भौतिक पुर्वाधार तर्फका योजनाहरु						
१	टोल विकास सँस्था अन्तर्गतका होडिड बोर्ड निर्माण कार्यक्रम	७०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	रकमान्तर गरिएको
२	अन्धराजा गेट पश्चिम हुदै इमानेटार जोड्ने वाटो गावैल	१,००,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	सम्प्लोता भई काम भइरहेको
३	आपझोला पुच्छर देखि बक्वा कलब भवन जाने वाटो गावैल	१,००,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
४	इमानेटार वाट चौविसे सम्म वाटो गावैल	१,००,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	सम्प्लोता भई काम भइरहेको
५	कृषिमार्ग दक्षिण कच्चिवाटो गावैल	२,५०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	सम्प्लोता भई काम भइरहेको
६	खनाल चोक देखि उत्तर देवी मन्दिर सम्म ट्रयाक तथा गावैल	५०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
७	खरायोटा देखि नेवार टोल हुदै हातिखरे सम्म गावैल	१,५०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	सम्प्लोता भई काम भइरहेको

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत	सौज्दात प्रतिशत	कैफियत
भौतिक पुर्वाधार तर्फका योजनाहरू						
८	ग्यास प्लान्टको छेउवाट ठाडो जाने वाटो दुधे खोला सम्म गावेल	७५,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
९	गौरिगाँउ वाटो गावेल	५०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	सम्झौता भई काम भइरहेको
१०	ज्योती चर्च देखि धिमालटार जोड्ने वाटो गावेल	५०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
११	दुधे खोलाको झोलुङ्गे पुल वारि- पारी वाटो निर्माण	१,५०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	सम्झौता भएको
१२	बकुवा दाहाल डाडा कल्भर्ट निर्माण (गापा सर्ग साझेदारी)	१०,००,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	गा.पा.को समन्वयमा टेक्का प्रक्रिया
१३	बकुवा पुल देखि गौरे किता सम्म गावेल	५०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	सम्झौता भई काम भइरहेको
१४	बाझो मा.वि. देखि स्वास्थ्य चौकी हुदै मगर टोल सम्म जाने वाटो गावेल	१,००,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	

क्र. सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत	सौज्दात प्रतिशत	कैफियत
भौतिक पुर्वाधार तर्फका योजनाहरू						
१५	रतुवा झोलुङ्गे पुल देखि कल्पटार सम्म वाटो निर्माण	२,००,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	सम्झौता
१६	विधुवा डिल हुदै भानु मा.वि. सम्म गावेल	१,५०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	सम्झौता भई काम भइरहेको
१७	हयुमपाइप खरिद तथा पुराई खर्च	५,००,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
१८	आयोजना व्यवस्थापन खर्च	१,१५,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
१९	वडा कार्यालय अगाडिको खाली गहिरो भाग पुर्ने तथा ब्लक लगाउने	१,६०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	काम सम्पन्न भइ सकेको भुक्तानी बाकी
२०	सेनियाङ्गको घर देखि पोखरी टोल जोड्ने वाटो गावेल	५०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	
जम्मा		३,४७०,०००।-	०।-	०.००%	१००.००%	

चुलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ५ को कार्यालयमा प्राप्त भएका सिफारिस। निवेदन। पत्रहरुको दर्ता विवरण			
क्र.स.	प्राप्त निकाय	संख्या	कैफियत
१	चुलाचुली गाउँपालिकाबाट प्राप्त	७८	
२	अन्य कार्यालयहरु तथा संघ सँस्थाहरुबाट प्राप्त	६२	
३	व्यक्तिगत निवेदनहरु प्राप्त	३७८	
जम्मा		५१८	

चुलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ५ को कार्यालयबाट भएका सिफारिस। निवेदन। पत्रहरुको चलानी विवरण			
क्र.स.	प्राप्त निकाय	संख्या	कैफियत
१	चुलाचुली गाउँपालिकामा	१४०	
२	अन्य कार्यालयहरु तथा संघ सँस्थाहरुमा	१२१	
३	व्यक्तिगत सिफारिस पत्र	२४८	
जम्मा		५०९	

**चुलाचुली गाउँपालिका वडा नं. ५ को आ.व. २०७८।७९ मा
उठाइएको
आन्तरिक आम्दानी (राजश्व) को विवरण**

क्र.स.	आम्दानीको स्रोत	रकम रु.	कैफियत
१	मालपोत	५०,३६०।-	
२	नगदी	२,११,६५०।-	
जम्मा रकम रु.		२,६२,०१०।-	

**ब्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण
वडा नं. ५**

क्र.स.	ब्यक्तिगत घटना	महिला	पुरुष	जम्मा
१	जन्म दर्ता	२४ जना	२१ जना	४५ जना
२	मृत्यु दर्ता	११ जना	१६ जना	२७ जना
३	सम्बन्ध बिच्छेद	-	-	-
४	विवाह दर्ता			३६ जोडि
५	बसाई सरी आएको परिवार संख्या			११ परिवार
६	बसाई सरी जाने परिवार संख्या			८ परिवार

**सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि विवरण वडा नं.
५ चूलाचूली इलाम।**

क्र.स	त्रैमासिक	जम्मा वितरण संख्या	जम्मा वितरण रकम रु.	कैफियत
१	पहिलो	२६४	२३,८१,६२९।-	
२	दोस्रो	२६१	२३,८६,९४६।-	
	जम्मा	५२५	४७,६८,५७५।-	

अन्यमा:

**मिति २०७८ श्रावण ०१ गते देखि २०७८ पौष मसान्त सम्ममा जम्मा १६ वटा
वडा समितिको बैठक बसिएको छ।**

धन्यवाद !

नमस्कार!!

**आ.व. २०७८/०७९ मा सञ्चालित योजना तथा
कार्यक्रमहरूको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम**

**२०७८ फागुन ३० गते
सोमबार**

**आयोजक
चुलाचुली गाउँपालिकाको कार्यालय
चुलाचुली, ईलाम**

चालू खर्चतर्फ

वडा नं. ६				
क्र.सं.	शीर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च भएको	खर्च प्रतिशत
१	पदाधिकारी बैठक भत्ता नं ६	१,४४,०००	९९,०००	३९.२५
२	पानी बिजुली वडा नं ६	३०,०००	२६,०००	८६.८७
३	संचार महसुल तथा इन्टरनेट वडा नं ६	७०,०००	७,१५०	१०.२१
४	ईन्धन कार्यालय प्रयोजन वडा नं ६	७०,०००	३७,९३४.३०	५४.९०
५	सवारी साधन मर्मत वडा नं ६	६२,०००	१३,४५०	२१.६९
६	विमा तथा नविकरण खर्च वडा नं ६	२०,०००	२०,०००	१००
७	मेशिनरी औजार मर्मत सम्भार तथा सन्चालन खर्च वडा नं ६	३०,०००	३०,०००	१००

चालू खर्चतर्फ				
वडा नं. ६				
क्र.सं.	शीर्षक	बिनियोजित बजेट	खर्च भएको	प्रति
८	प्रशंसा चर्च भवन मर्मत	२५,०००	२५,०००	९
९	बाटो मर्मत ज्यामी	४०,०००	४०,०००	९
१०	मसलन्द तथा कार्यालय सामाग्री	१,५०,०००	७५,६६४.८०	५०
११	ईन्धन पदाधिकारि	४८,०००	९०४८.८५	१८
१२	पत्रपत्रिका छपाई तथा सूचना प्रकाशन	३०,०००	०	
१३	चट्याङ विपद न्यूनिकरण	१,००,०००	०	
१४	खेलकुद विकास कार्यक्रम	१,००,०००	०	
१५	दलित लक्षित कार्यक्रम	१,००,०००	०	

वडा नं.६
पूँजीगत

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट
वडा नं.६		
१	फुङनाम कृषि उपज संकलन केन्द्र बवन निर्माण वडा नं ६	२,००,००
२	राष्ट्रप्रेमी मा वि भवन मर्मत वडा नं ६	१,५०,००
३	श्री शहिद स्मृती आ वि शौचालय निर्माण तथा भवन मर्मत वडा नं ६	३००,००
४	सवारी साधन खरिद (मोटरसाईकल १ वटा वडा नं ६ को लागि	३,००,००
५	कार्यालयमा ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिद वडा नं ६	१,००,००

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
वडा नं.६				
६	मिकलाजुङ पदमार्ग निर्माण वडा नं ६	१००,०००	०	०
७	पत्थरे बाटो निर्माण वडा नं ६	१,००,०००	१,००,०००	१००
८	बैधेकालिटार सडक निर्माण वडा नं ६	१,४०,०००	०	०
९	सिस्ने डाडा सिम्ले सडक निर्माण वडा नं ६	१,००,०००	०	०
१०	वेल चोक कर्केनी माजपाल बाटो निर्माण वडा नं ६	१,५०,०००	०	०
११	बगर टोल बाटो ग्राभेल वडा नं ६	४,००,०००	०	०
१२	दशमी मावाखोला सडक निर्माण वडा नं ६	३,००,०००	०	०
१३	बगर टोल ३ ठाउँ हयुम पाईप कल्भर्ट निर्माण वडा नं ६	२,००,०००	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
वडा नं.६				
१४	किरातँ चोक बाटो लोकपालको घर छेउ कल्भर्ट निर्माण वडा नं ६	१,३०,०००	०	०
१५	त्रिवेणी सडक मर्मत वडा नं ६	३,००,०००	०	०
१६	पश्चिम लोसे बाटो निर्माण वडा नं ६	१,००,०००	०	०
१७	भन्डारी खोल्सा सडक निर्माण वडा नं ६	१,००,०००	०	०
१८	खपाङ्गी टोल बाटो ग्राभेल वडा नं ६	१,५०,०००	०	०
१९	देवी स्थान तेर्सो बाटो ग्राभेल वडा नं ६	७०,०००	०	०
२०	शान्ति चोक उत्तर बाटो ग्राभेल वडा नं ६	१,५०,०००	०	०

को बाटो मर्मत

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
वडा नं.६				
२२	जोगी डाडा तोल्नी बारी कालिटा सडक निर्माण वडा नं ६	२,००,०००	०	०
२३	मावाखोला तटबन्धन निर्माण वडा नं ६	३,००,०००	३,००,०००	१००
२४	कर्केनी घतानेटार खानेपानी निर्माण वडा नं ६	२,००,०००	०	०
२५	सिस्ने टोल खानेपानी ट्याङ्की निर्माण वडा नं ६	२,००,०००	०	०
२६	माकाधुप्पा खानेपानी आयोजना वडा नं ६	१००,०००	०	०
२७	बरगैरी खावाना खानेपानी वडा नं ६	१,५०,०००	०	०
२८	जलपादेवी भोजला कुवा मर्मत वडा नं ६	६०,०००	०	०
२९	देवीथाने खानेपानी रिजर्भ वायर ट्याङ्की निर्माण वडा नं	१,००,०००	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
वडा नं.६				
३१	साकफारा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र भवन मर्मत वडा नं ६	२,२५,०००	०	०
३२	कालापानी ढल निकास योजना वडा नं ६	४,००,०००	०	०
३३	फूडनाम स्पोर्टिङ क्लब वडा नं ६	१,००,०००	०	०
३४	माइसुङ्ला शौचालय निर्माण वडा नं ६	२,००,०००	०	०
३५	आहाले मन्दिर निर्माण वडा नं ६	१,००,०००	०	०
३६	चुलाचुली आ वि भवन मर्मत वडा नं ६	१,००,०००	०	०

क्र.सं.	कार्यक्रमको नाम	विनियोजित बजेट	खर्चको अवस्था	खर्च प्रतिशत
वडा नं.६				
३७	मलामी टहरा निर्माण वडा नं ६	१,५०,०००	०	०
३८	गितान्जलि आ वि गेट निर्माण वडा नं ६	१,५०,०००	०	०
३९	मावाखोला रमिते खानेपानी आयोजना वडा नं ६	१,५०,०००	०	०
४०	रमिते खेलमैदान मर्मत वडा नं ६	१,५०,०००	०	०
	जम्मा	७,३५,०००	८,५०,०००	११.९१
			मौजदात	६२,८५,०००

व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण

वडा नं. ६

क्र.स	व्यक्तिगत घटना	महिला	पुरुष	जम्मा
१	जन्म दर्ता	२१	१८	३९
२	मृत्यु दर्ता	१२	७	१९
३	सम्बन्ध बिच्छेद			०
४	विवाह दर्ता			३१
५	बसाई सरी आएको परिवार संख्या			४६/१३६
६	बसाई सरी जाने परिवार संख्या			९/२७
वडा बाट भएका सिफारिस				
१	गा.पा. मा पठाएको सिफारिस			२५५
२	अन्यत्र पठाएको सिफारिस			७१६

धन्यवाद ।।।
